


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

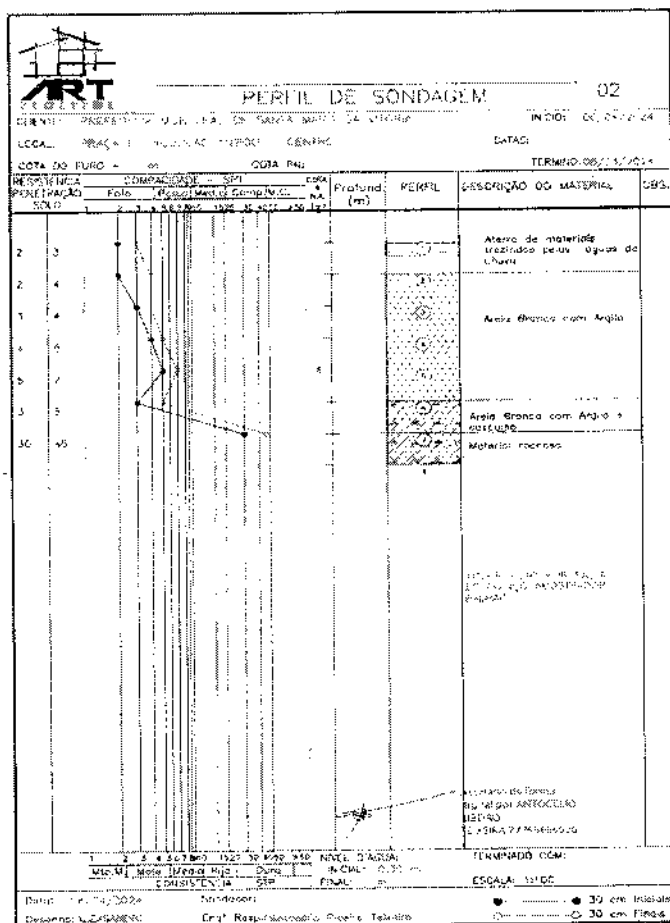

Segundo esta análise de solo é possível encontrar a partir de 2,00 metros de profundidade terreno com areia e com capacidade de absorção próximo a 2,00 tf/cm². Enquanto que o projeto de fundação necessita de um terreno com capacidade de para 1,57 tf/cm².

Santa Maria da Vitória, 13 de Maio de 2024.

Yuri de Brito Neves
Arquiteto e Urbanista - CAU 36.059-7



<http://projetoarquitetonico.ba.gov.br/validaDoc.seam>

ALINHO DE 2024	
PRACA JARDIM FIFA LENIRIO SANTA MARIA DA VITORIA - BA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA	
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	
PROJETO - ARQUITETÔNICO	
VISTO DA BOTO NEVES	
01	
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	



EXECUTIVO

2024 - Novembro - 27
29 de julho de 2024



COORDENADAS:
LAT. - 13°43'05.72"
LONG. - 44°11'43.27"O


TÍTULO	
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFÁ	
Escala: 1:1000	
Nº FOLHA: 02	
AUTOR: VIVIANE DE BRITO NEVES	
PROJETO: ARQUITETÔNICO	
PLANTA DE SITUAÇÃO	
LOCAL: PRAÇA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA: 1.000,00 m²	
DATA: 10/06/2024	

<http://globoimpressaooficial.org/>



FIGURA


<http://pmsantamariadavitoria.ba.ba.impressoficial.org/>

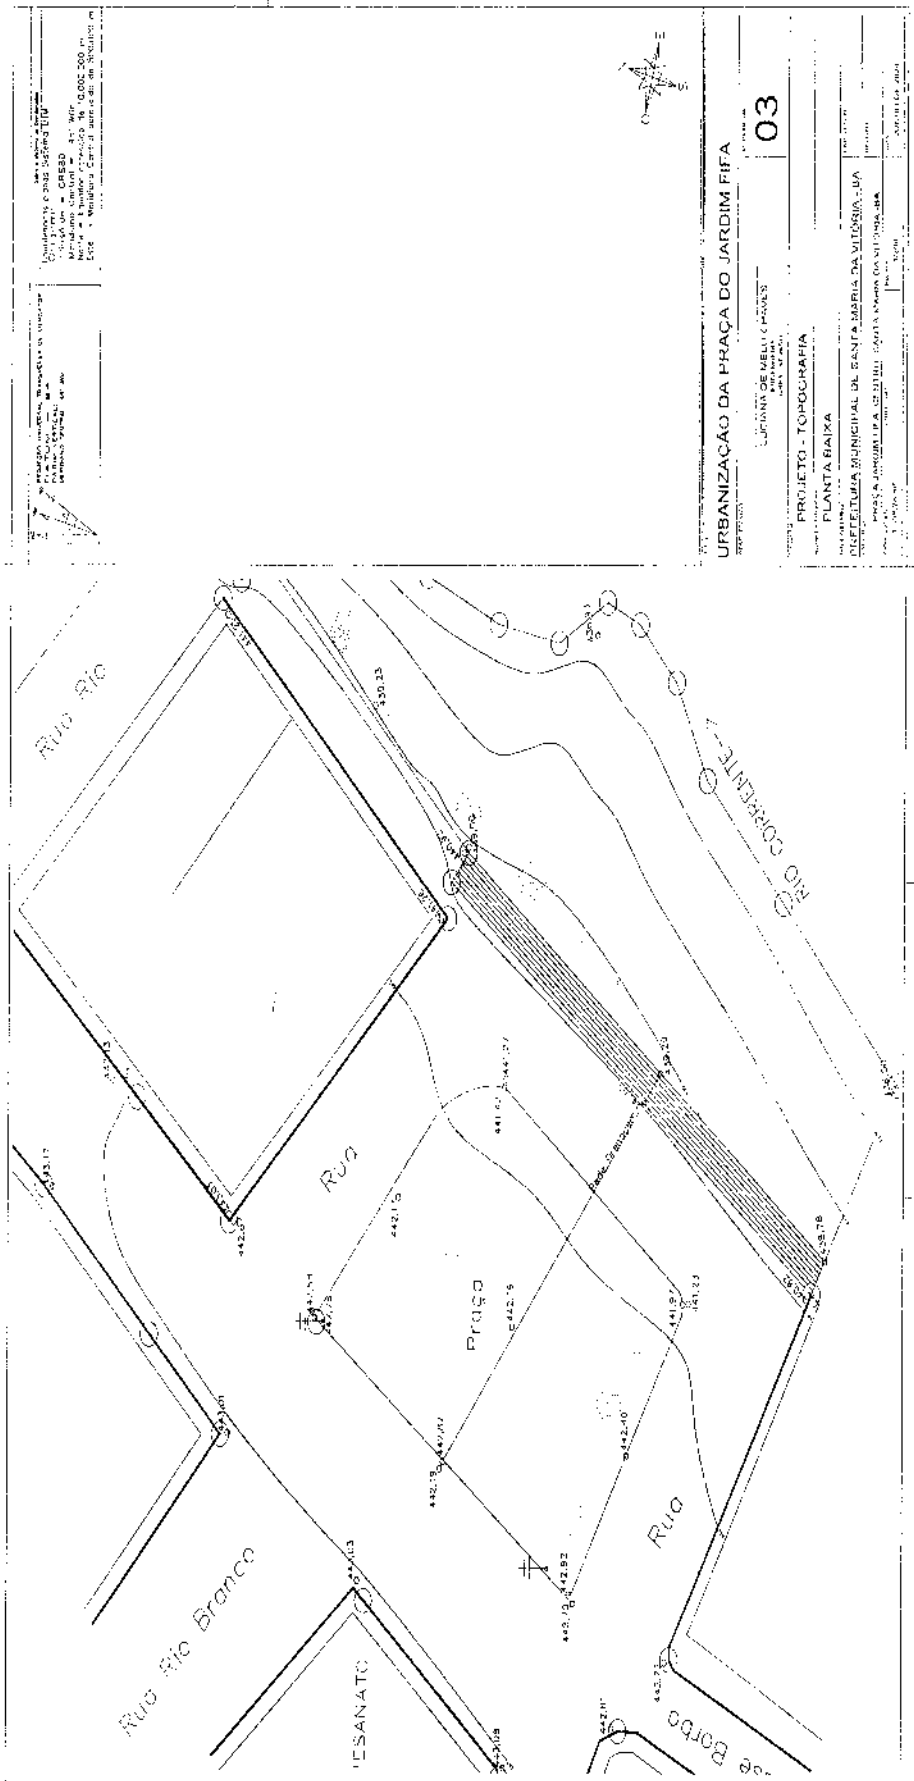


EXECUTIVO



COORDENADAS - BOTA FORA:
LAT. - 13°21'56,3"S
LONG. - 44°11'33,8"W

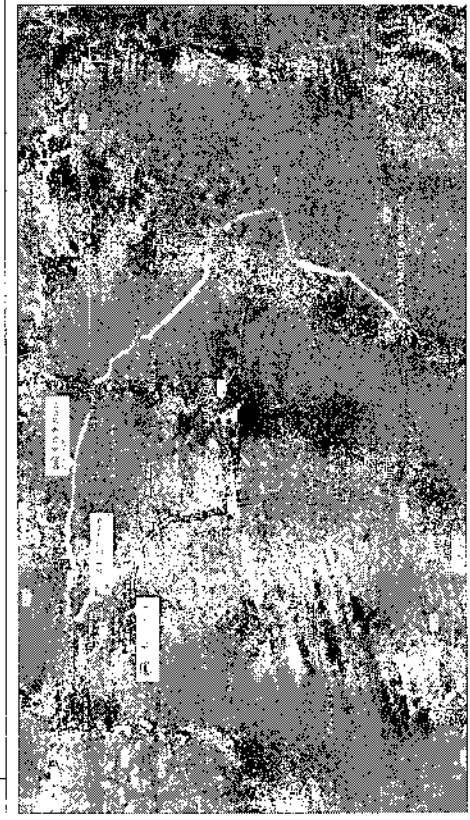

DMT - BARREIRAS / SANTA MARIA DA VITÓRIA:
DISTÂNCIA - 221,00 KM




URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFÁ

04

PROJETO - ARQUITETÔNICO	
DMT E BOTA FORA	
PRAÇA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
AUTOR: ARQUITETO	
DATA: 2024	
Escala: 1:100	




<http://pmsantamariadavitoria.ba.br/impressaooficial.org/>

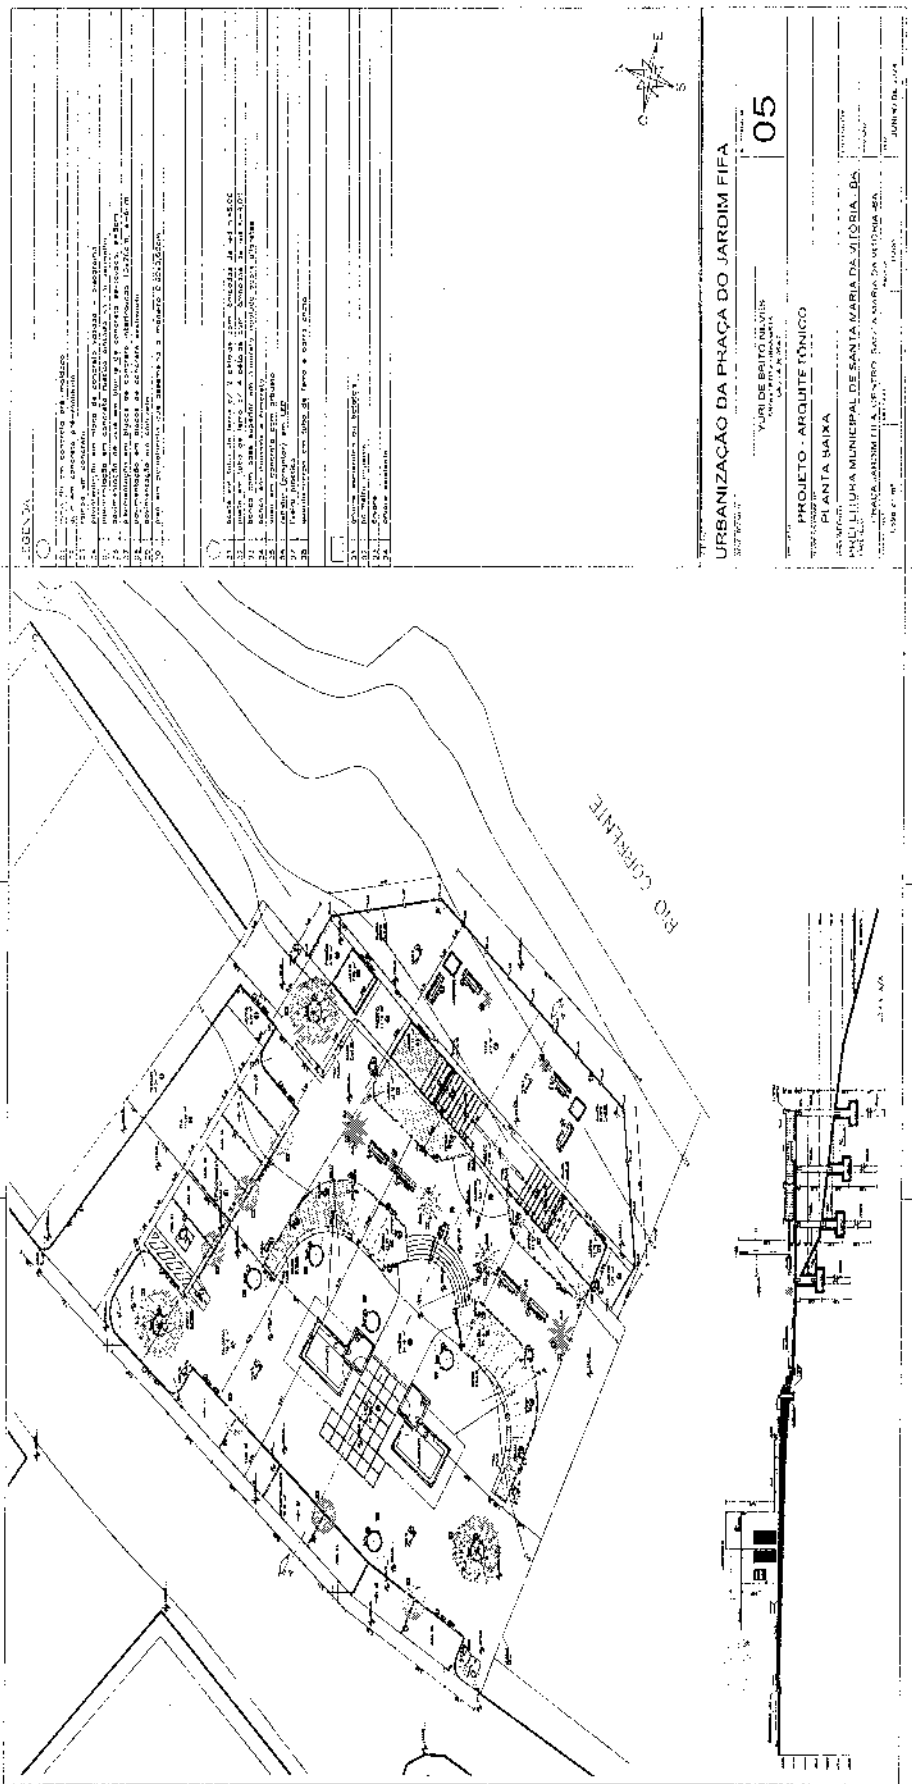


[illegible]




<http://dmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

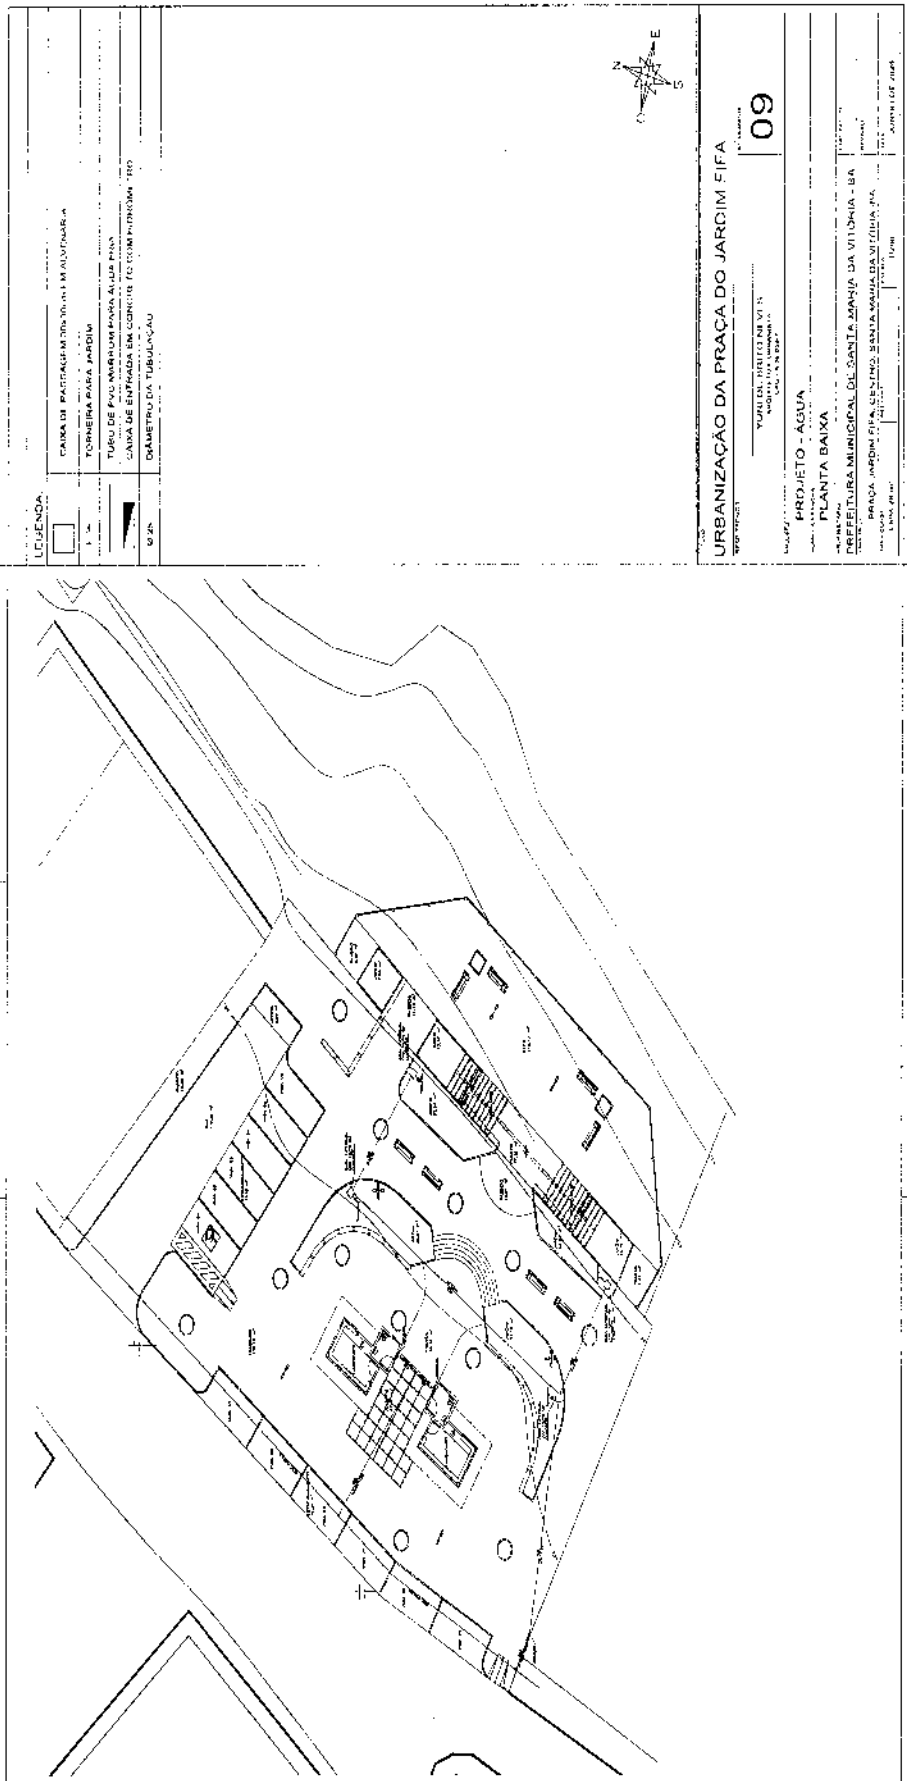

1000000
EXECUTIVO

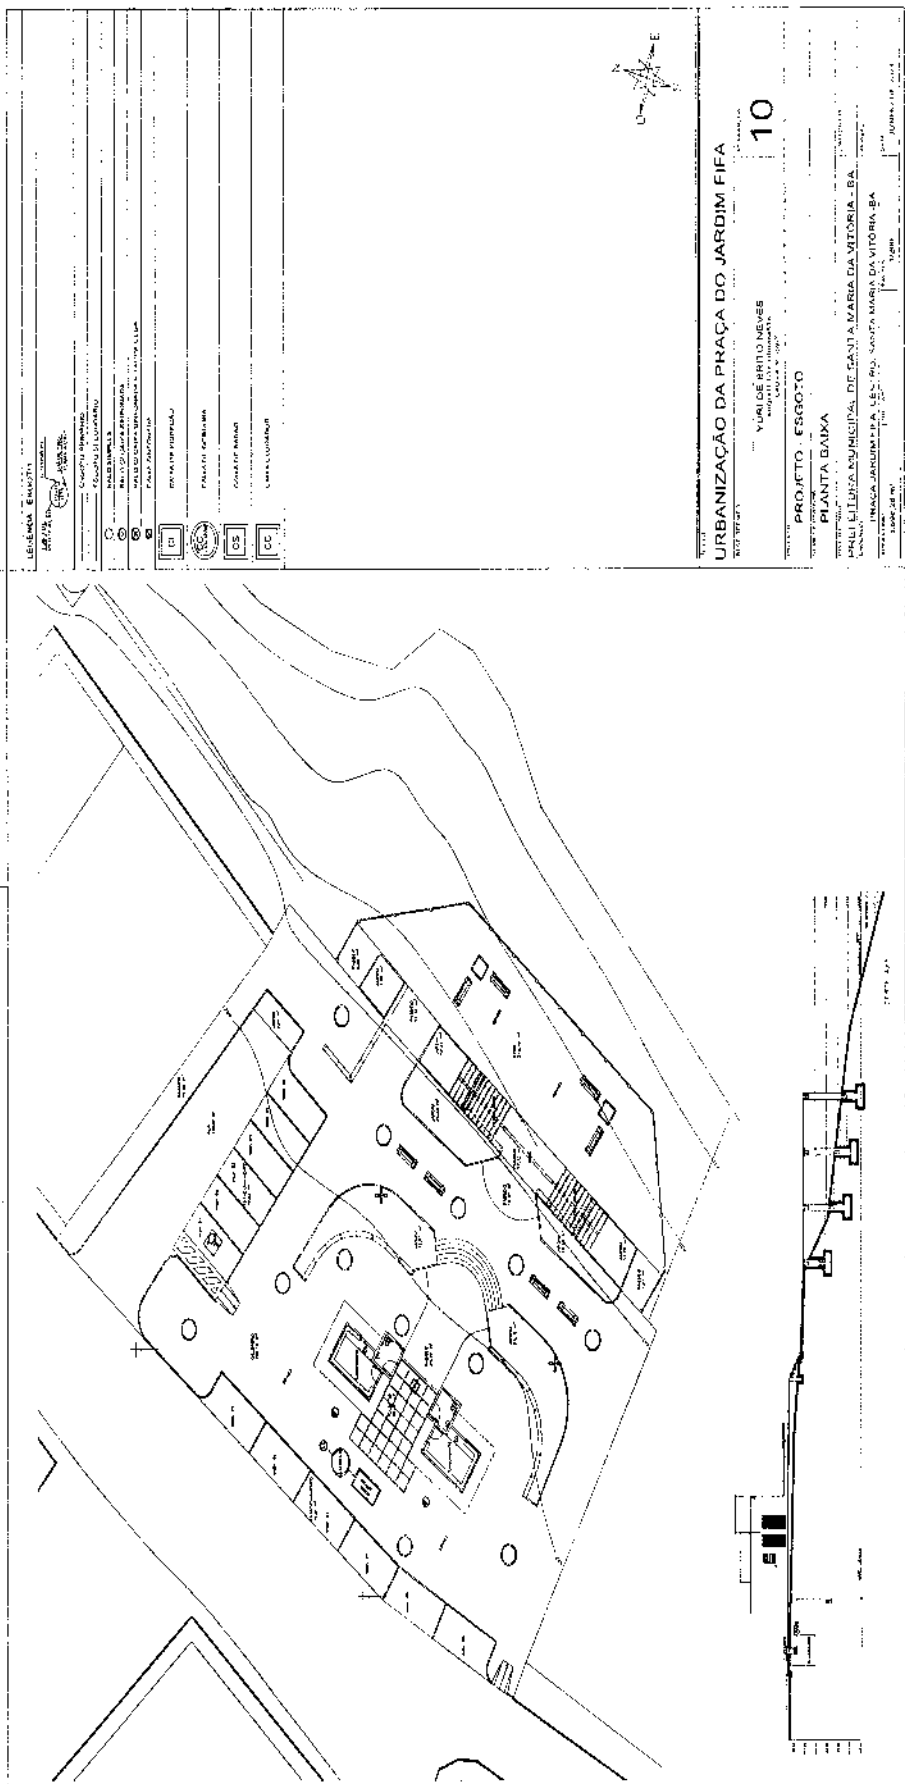

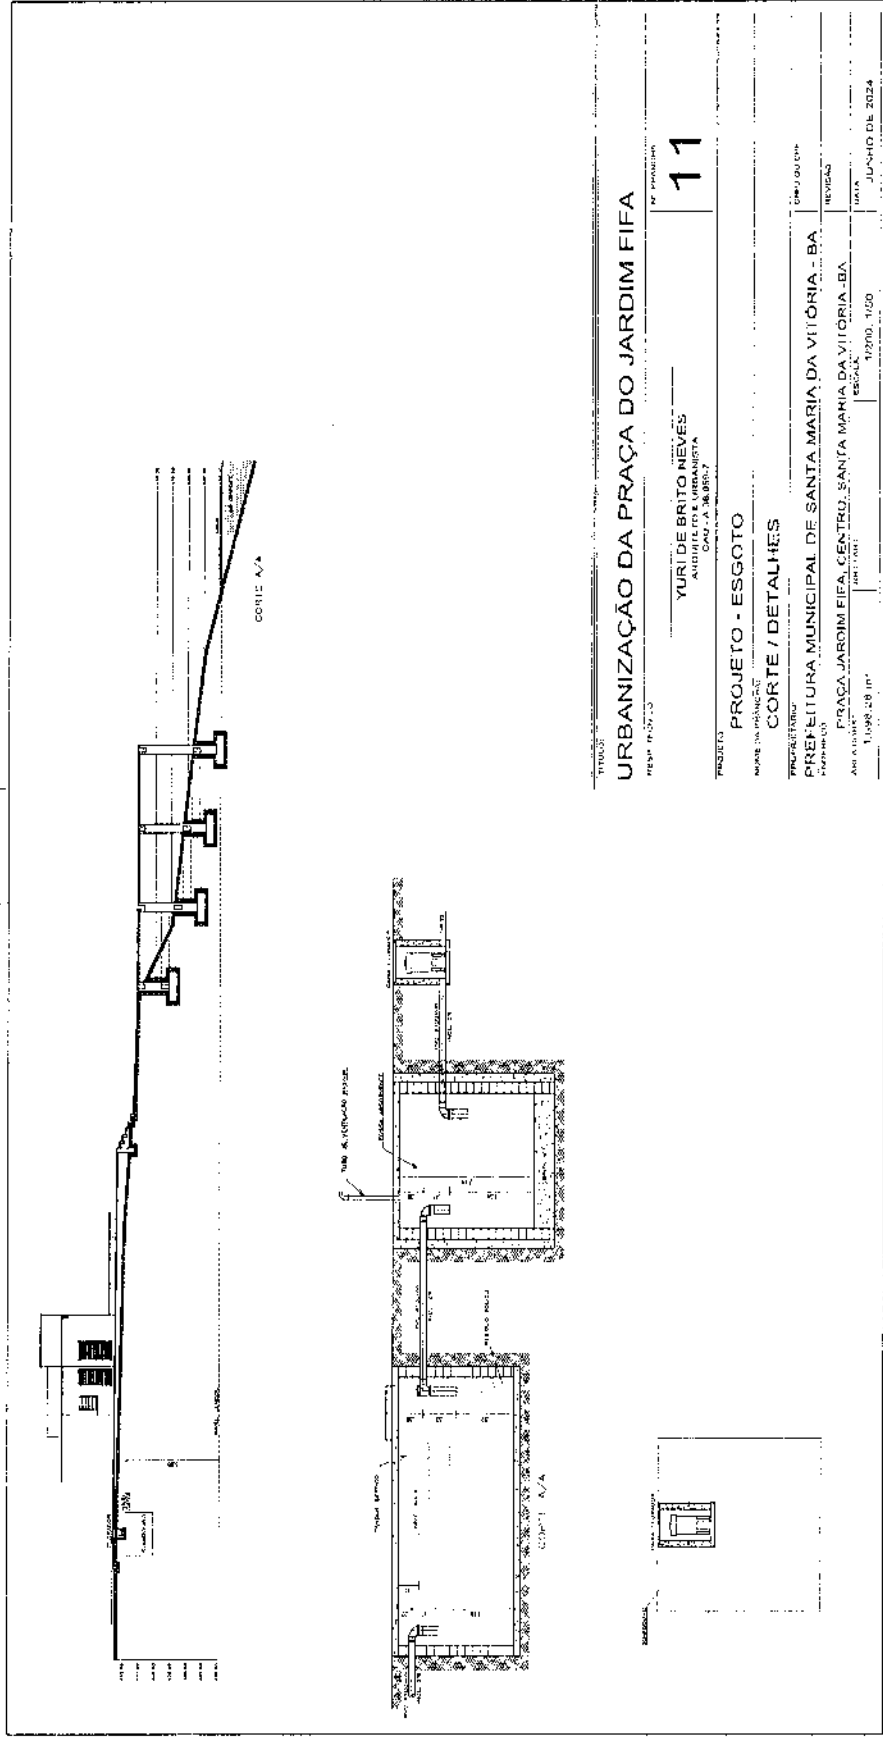

<http://www.santamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>






<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>





- 109 -

Schizothorax sinensis



<http://pmsantamariadavitoriaiba.imprensaoficial.org/>



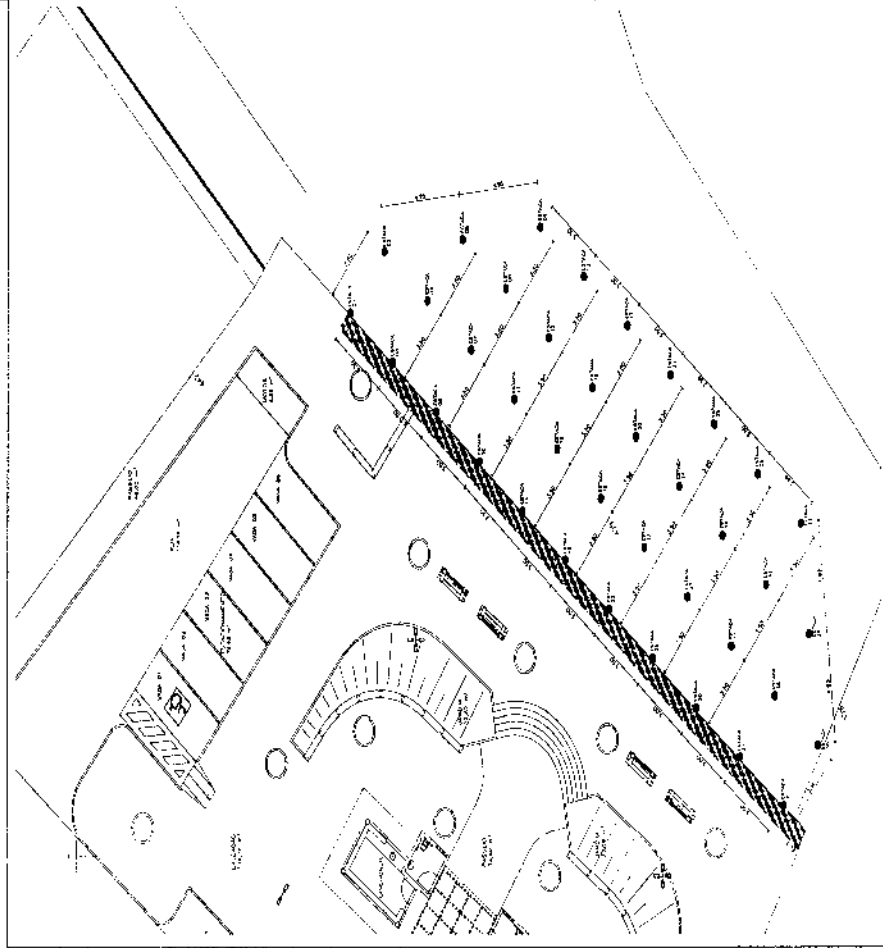

TÍTULO:
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FFA


DESENHO: T. F. F. F.

Nº FOLHA:
14

PROJETO - ESTRUTURA DECK
PLANTA DE ESTAKEAMENTO

PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA: 1.000,00 m²		ÁREA: 1.000,00 m²	
LARGURA: 20,00 m		LARGURA: 20,00 m	
LARGURA: 20,00 m		LARGURA: 20,00 m	



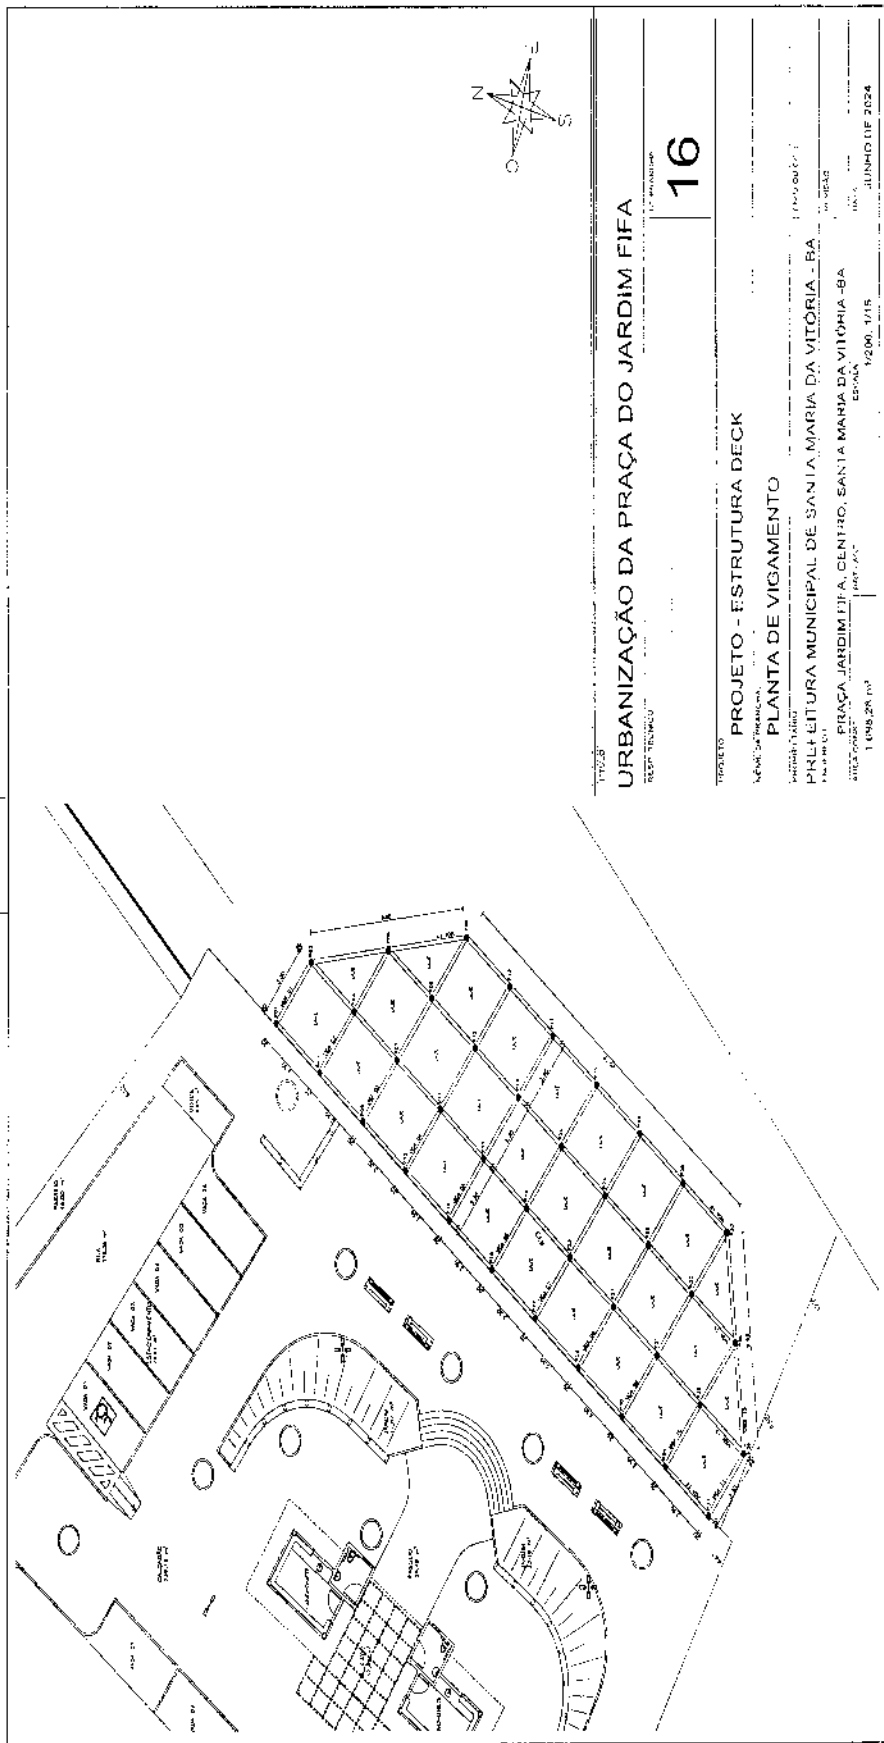

<http://www.pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



<http://portal.oab.org.br/portal/validaDoc.seam>

Item	Descrição	Valor	Observações
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

EXECUTIVO




<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

The figure consists of 18 technical drawings of a bridge structure, arranged in a grid-like fashion. The drawings are labeled 'BRIDGE' and '18'. The drawings show various views of the bridge, including side elevations, cross-sections, and details of the structure. The drawings are arranged in a grid-like fashion, with some drawings showing the bridge from a side perspective and others showing cross-sections. The drawings are labeled with 'BRIDGE' and '18'.

EXECUTIVO

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

Second-Hand
Books & Manuscripts



Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bb4bb697b5d8

00 00
 00 00 00
 00
 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00
 00 00
 00
 00 00

<http://pmsantamariadavitoriaa.imprensaoficial.org/>




Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2e-a04d-bb4dbb697b5d8

$\frac{1}{2}$


<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>




<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

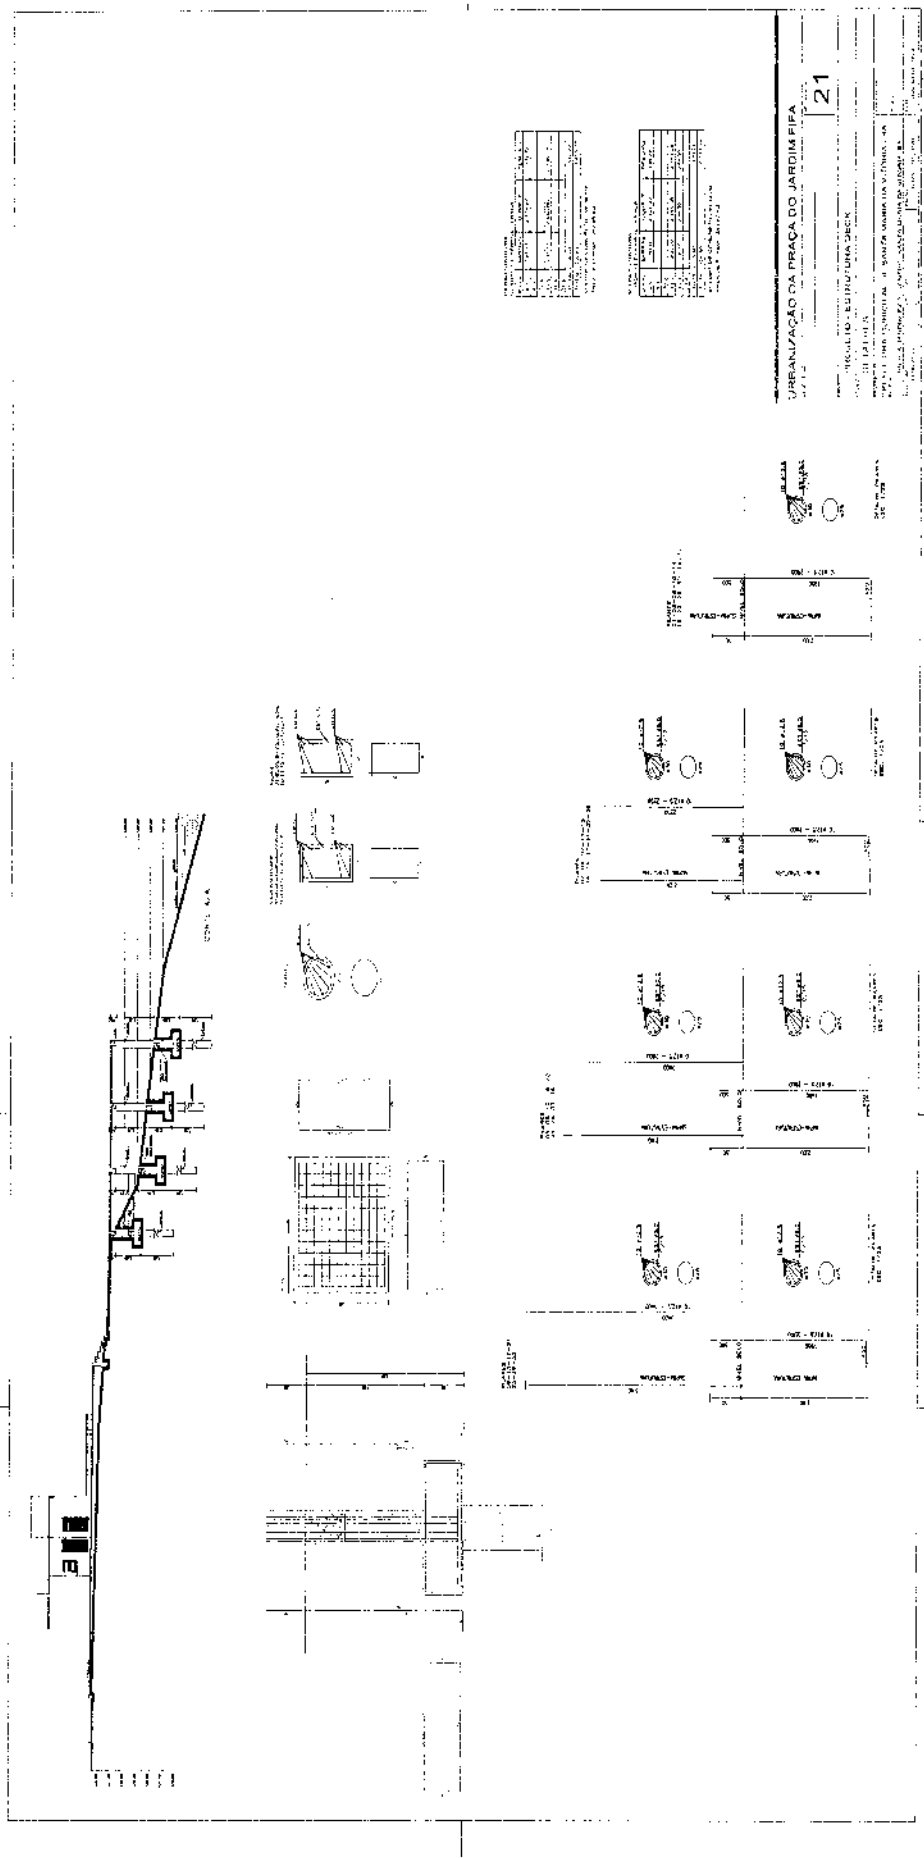

EXECUTIVO

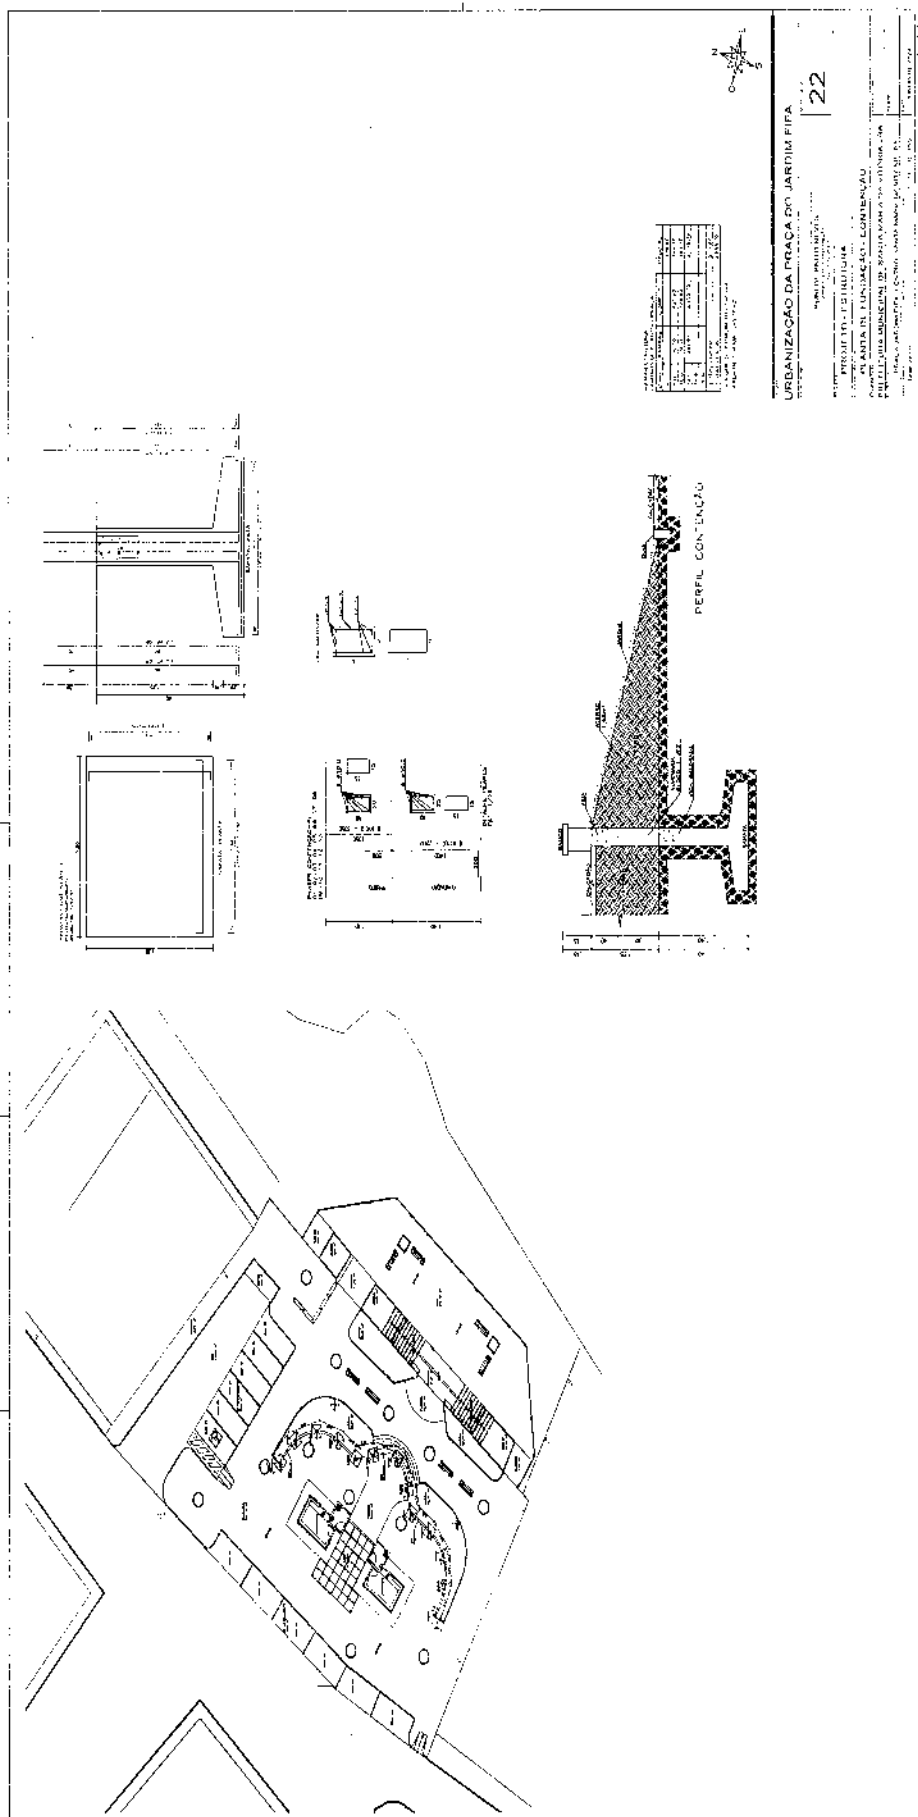






Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2e-a04d-bb4dbb697b5d8


<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

[illegible]

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

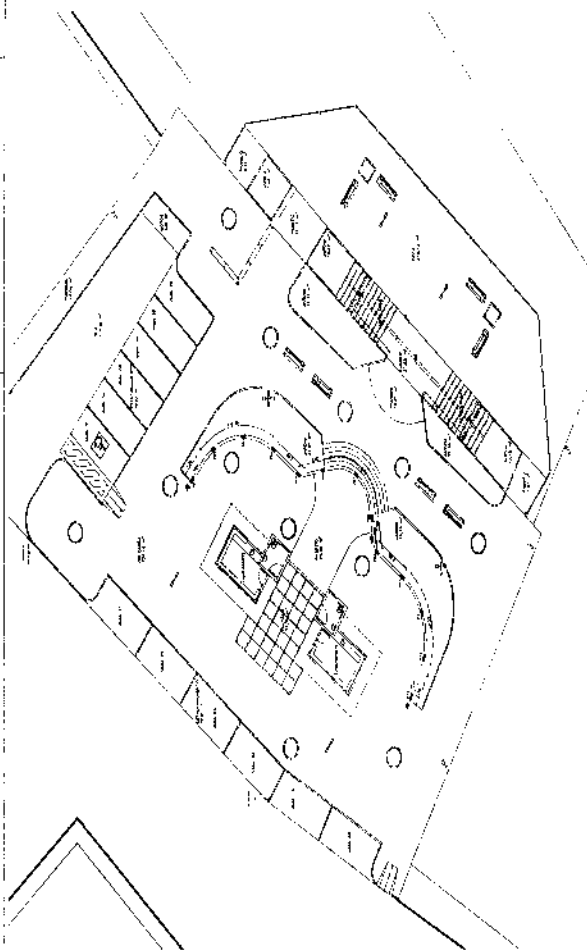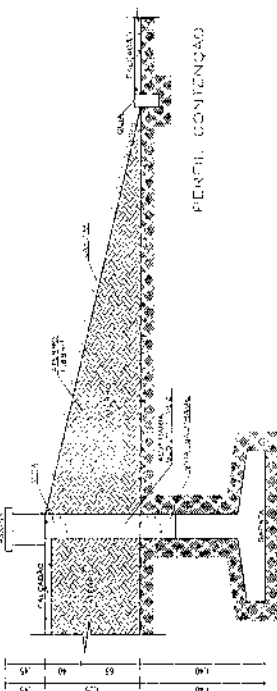
[illegible]




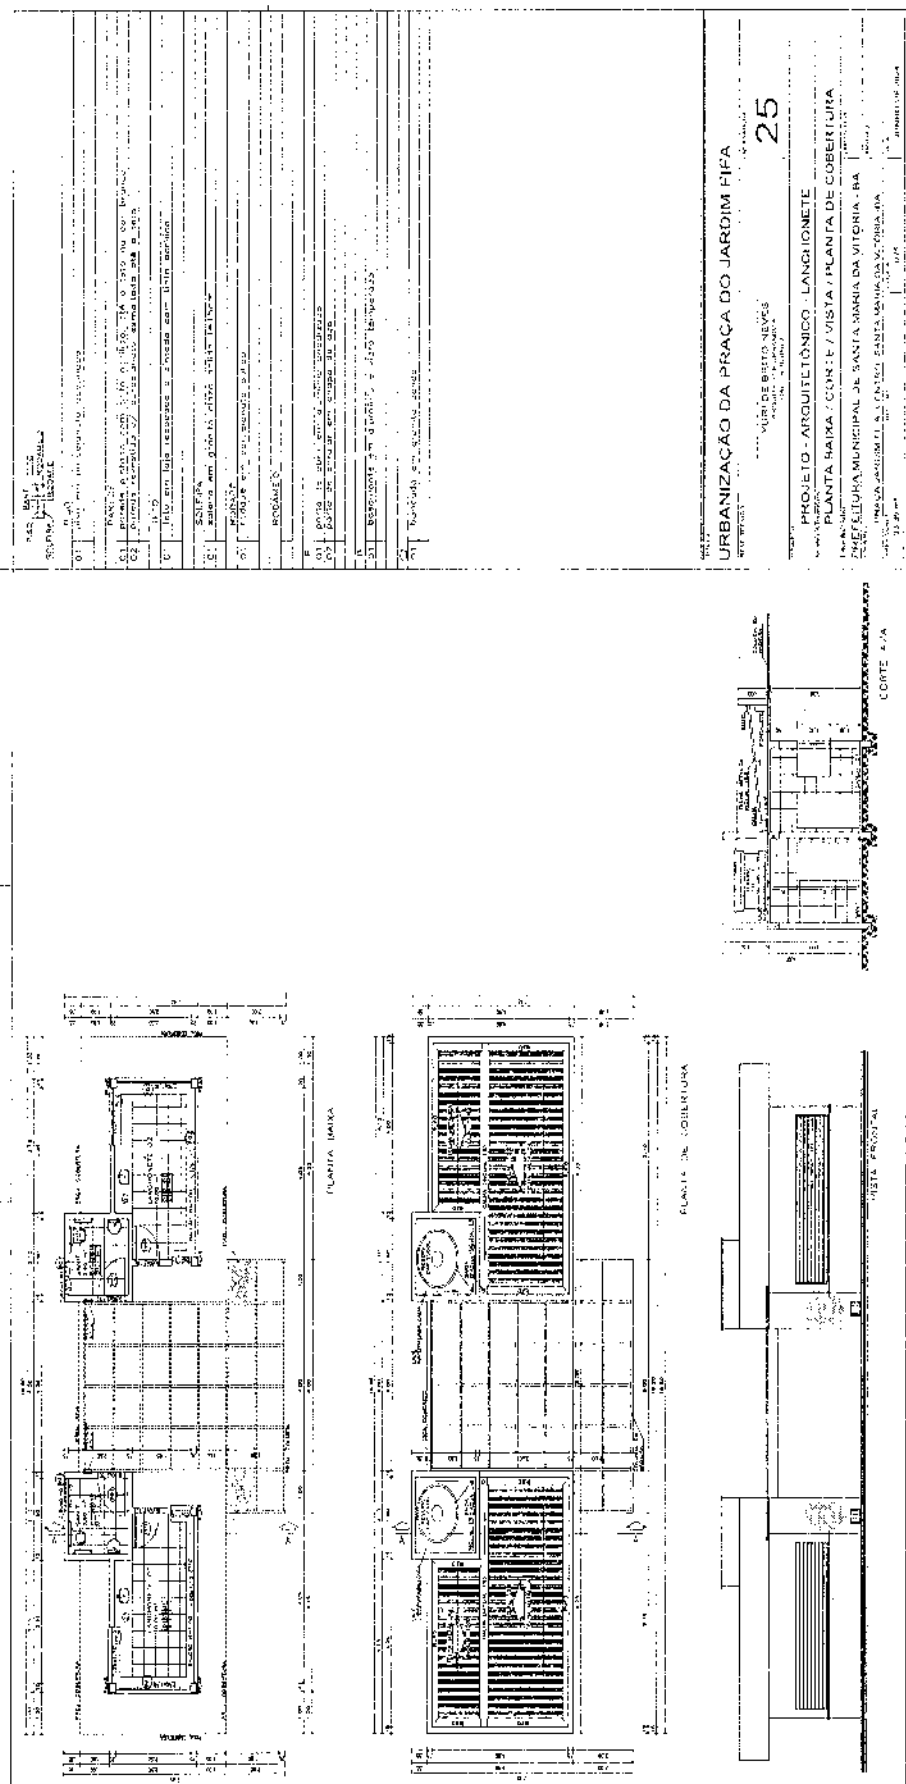




EXECUTIVE

The figure consists of three architectural drawings related to the roof and water system of a lunchette project. The top drawing is the 'PLANTA DE COBERTURA' (Roof Plan), showing a rectangular building footprint with a grid pattern. The middle drawing is a detailed view of the 'PLANTA DE ÁGUA' (Water Plant), showing the layout of the water storage tank and associated piping. The bottom drawing is a section view showing the roof structure, including the water tank and the roof slope, with labels for 'ÁGUA' (Water) and 'TETO' (Roof). The drawings are oriented vertically on the page.

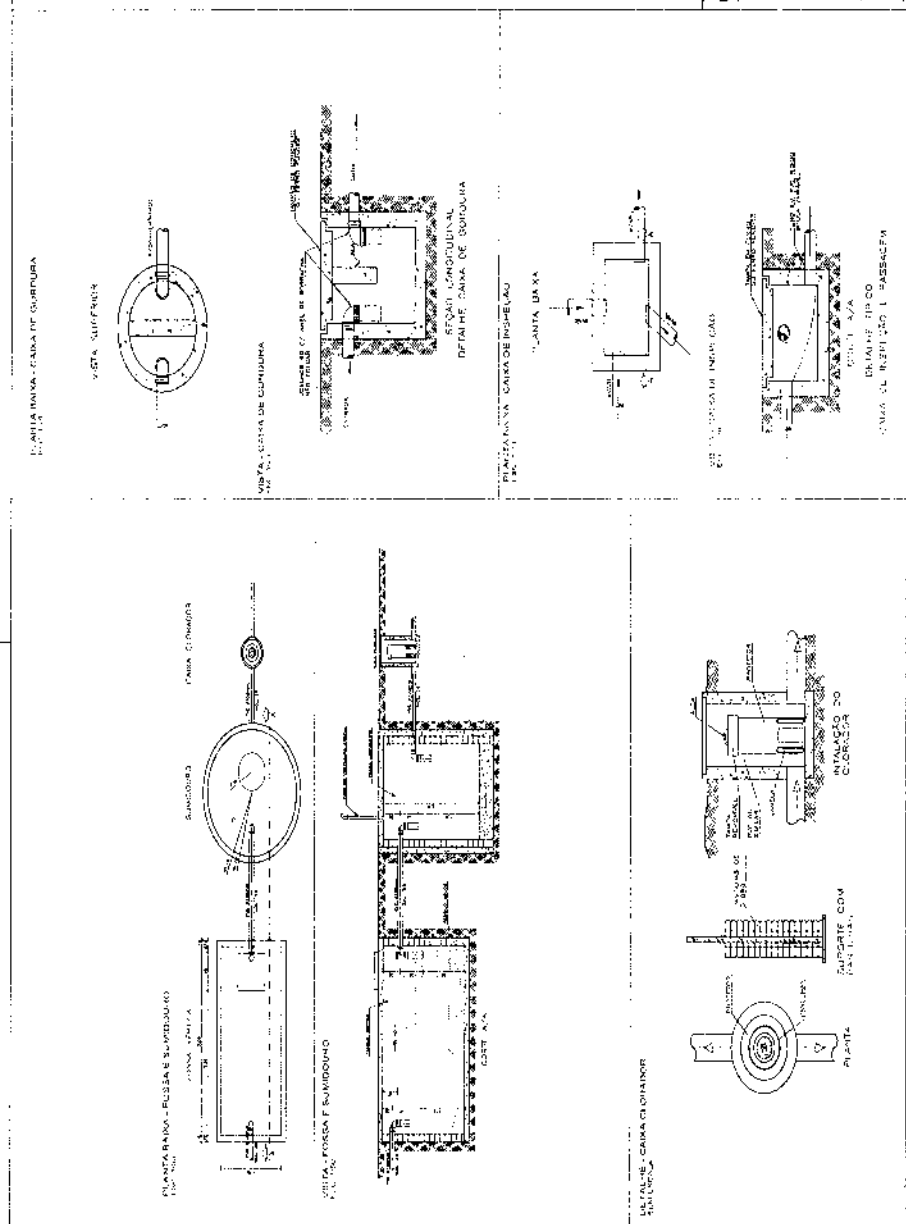[illegible]

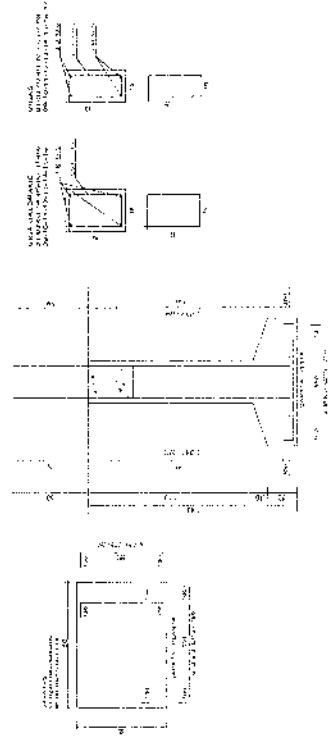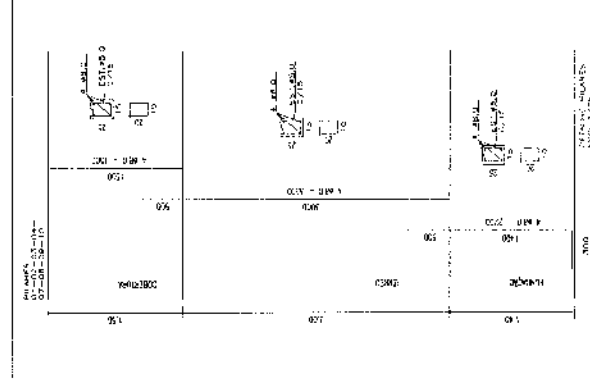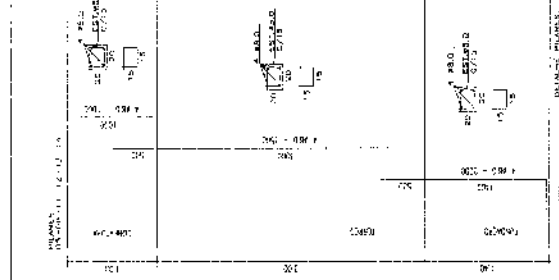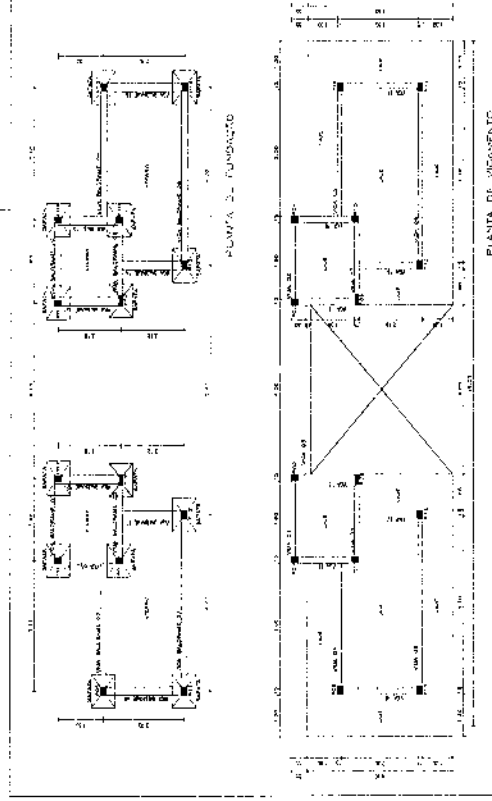[illegible]

Time (min)	Flow rate (ml/min)	Temperature (°C)	Pressure (atm)	Wavelength (nm)	Detector (AU)
0-10	1.0	40	1.0	254	10
10-20	1.0	40	1.0	254	10
20-30	1.0	40	1.0	254	10
30-40	1.0	40	1.0	254	10
40-50	1.0	40	1.0	254	10
50-60	1.0	40	1.0	254	10
60-70	1.0	40	1.0	254	10
70-80	1.0	40	1.0	254	10
80-90	1.0	40	1.0	254	10
90-100	1.0	40	1.0	254	10
100-110	1.0	40	1.0	254	10
110-120	1.0	40	1.0	254	10
120-130	1.0	40	1.0	254	10
130-140	1.0	40	1.0	254	10
140-150	1.0	40	1.0	254	10
150-160	1.0	40	1.0	254	10
160-170	1.0	40	1.0	254	10
170-180	1.0	40	1.0	254	10
180-190	1.0	40	1.0	254	10
190-200	1.0	40	1.0	254	10
200-210	1.0	40	1.0	254	10
210-220	1.0	40	1.0	254	10
220-230	1.0	40	1.0	254	10
230-240	1.0	40	1.0	254	10
240-250	1.0	40	1.0	254	10
250-260	1.0	40	1.0	254	10
260-270	1.0	40	1.0	254	10
270-280	1.0	40	1.0	254	10
280-290	1.0	40	1.0	254	10
290-300	1.0	40	1.0	254	10
300-310	1.0	40	1.0	254	10
310-320	1.0	40	1.0	254	10
320-330	1.0	40	1.0	254	10
330-340	1.0	40	1.0	254	10
340-350	1.0	40	1.0	254	10
350-360	1.0	40	1.0	254	10
360-370	1.0	40	1.0	254	10
370-380	1.0	40	1.0	254	10
380-390	1.0	40	1.0	254	10
390-400	1.0	40	1.0	254	10
400-410	1.0	40	1.0	254	10
410-420	1.0	40	1.0	254	10
420-430	1.0	40	1.0	254	10
430-440	1.0	40	1.0	254	10
440-450	1.0	40	1.0	254	10
450-460	1.0	40	1.0	254	10
460-470	1.0	40	1.0	254	10
470-480	1.0	40	1.0	254	10
480-490	1.0	40	1.0	254	10
490-500	1.0	40	1.0	254	10
500-510	1.0	40	1.0	254	10
510-520	1.0	40	1.0	254	10
520-530	1.0	40	1.0	254	10
530-540	1.0	40	1.0	254	10
540-550	1.0	40	1.0	254	10
550-560	1.0	40	1.0	254	10
560-570	1.0	40	1.0	254	10
570-580	1.0	40	1.0	254	10
580-590	1.0	40	1.0	254	10
590-600	1.0	40	1.0	254	10
600-610	1.0	40	1.0	254	10
610-620	1.0	40	1.0	254	10
620-630	1.0	40	1.0	254	10
630-640	1.0	40	1.0	254	10
640-650	1.0	40	1.0	254	10
650-660	1.0	40	1.0	254	10
660-670	1.0	40	1.0	254	10
670-680	1.0	40	1.0	254	10
680-690	1.0	40	1.0	254	10
690-700	1.0	40	1.0	254	10
700-710	1.0	40	1.0	254	10
710-720	1.0	40	1.0	254	10
720-730	1.0	40	1.0	254	10
730-740	1.0	40	1.0	254	10
740-750	1.0	40	1.0	254	10
750-760	1.0	40	1.0	254	10
760-770	1.0	40	1.0	254	10
770-780	1.0	40	1.0	254	10
780-790	1.0	40	1.0	254	10
790-800	1.0	40	1.0	254	10
800-810	1.0	40	1.0	254	10
810-820	1.0	40	1.0	254	10
820-830	1.0	40	1.0	254	10
830-840	1.0	40	1.0	254	10
840-850	1.0	40	1.0	254	10
850-860	1.0	40	1.0	254	10
860-870	1.0	40	1.0	254	10
870-880	1.0	40	1.0	254	10
880-890	1.0	40	1.0	254	10
890-900	1.0	40	1.0	254	10
900-910	1.0	40	1.0	254	10
910-920	1.0	40	1.0	254	10
920-930	1.0	40	1.0	254	10
930-940	1.0	40	1.0	254	10
940-950	1.0	40	1.0	254	10
950-960	1.0	40	1.0	254	10
960-970	1.0	40	1.0	254	10
970-980	1.0	40	1.0	254	10
980-990	1.0	40	1.0	254	10
990-1000	1.0	40	1.0	254	10

[illegible]




Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bb4dbb697b5d8

<http://pmsantamariadavitoriaiba.imprensaoficial.org/>


PROJETO: ARQUITETÔNICO - PERGOLADO	32
PLANTA: CASA : P. INT. : VISTA / COBERTURA	
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL, UL. SANTA MARIA, BA. VITÓRIA, BA.	
PROJ. ARQUIT. : P. A. : 11/70, L. A. MARIA DA VITÓRIA - BA.	
PROJ. CIVIL : P. C. : 11/70, L. A. MARIA DA VITÓRIA - BA.	




PLANTA DI COLLETTA



WISIA KONIA




7.1834



PLANTA HANNA


EXECUTIVO




Secondo l'articolo 202
del Regolamento 278
della Commissione

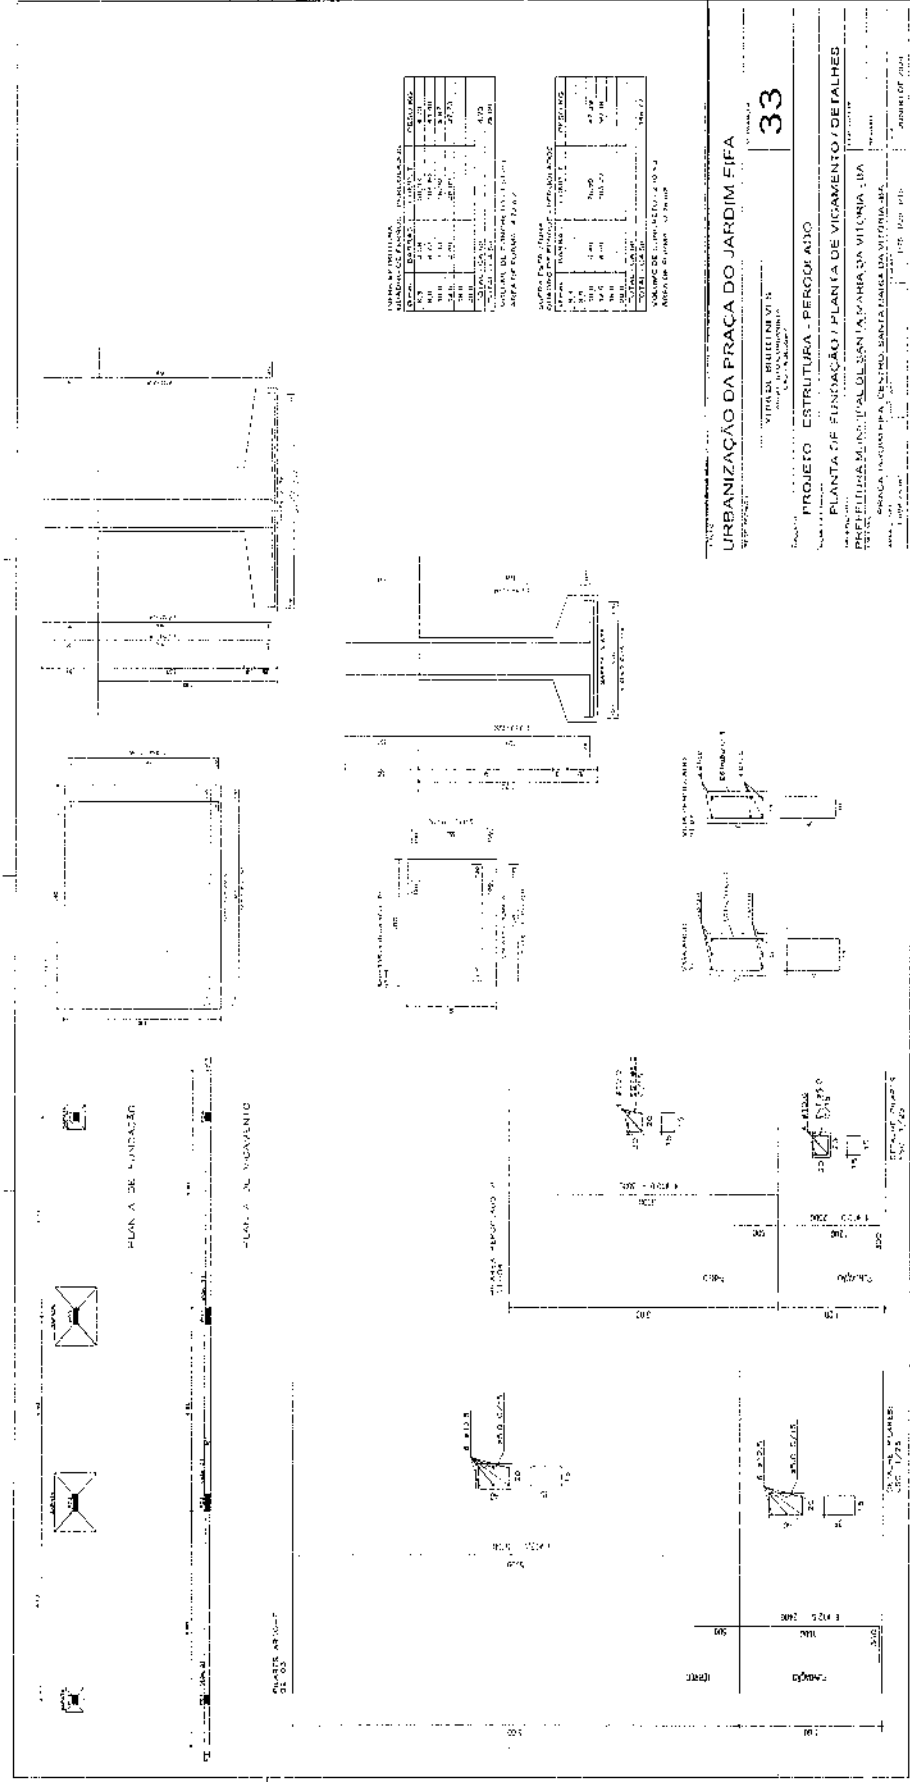



△
△
△

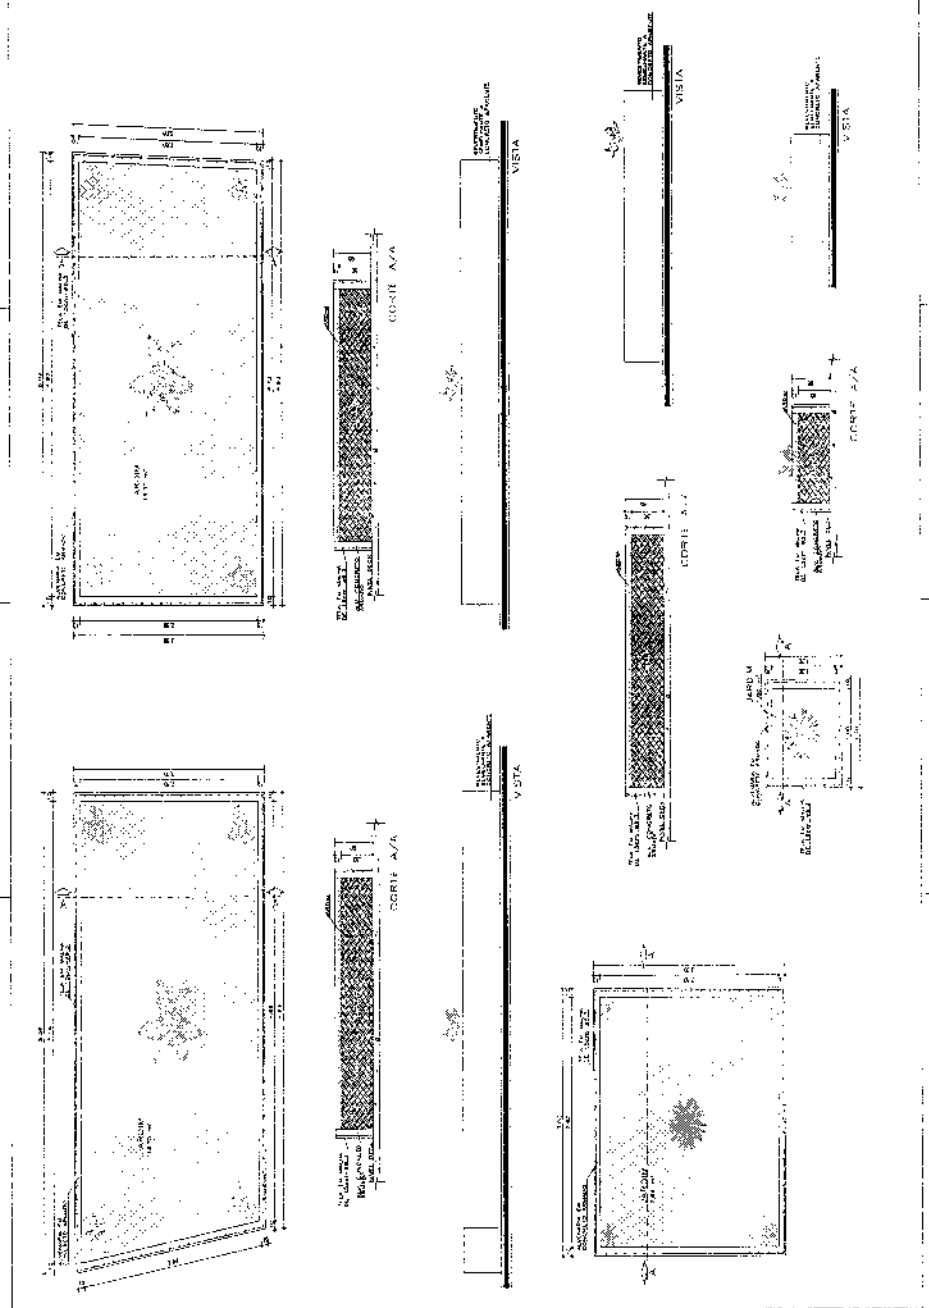[illegible]

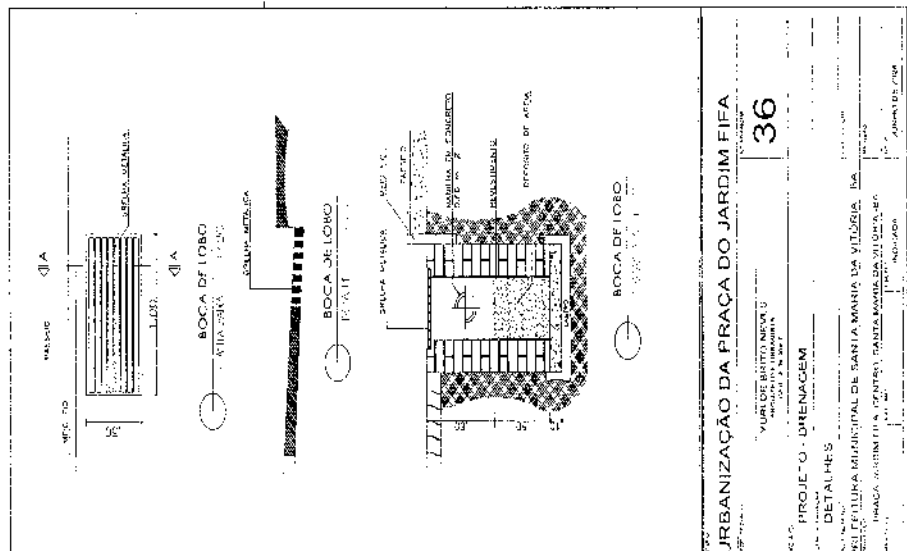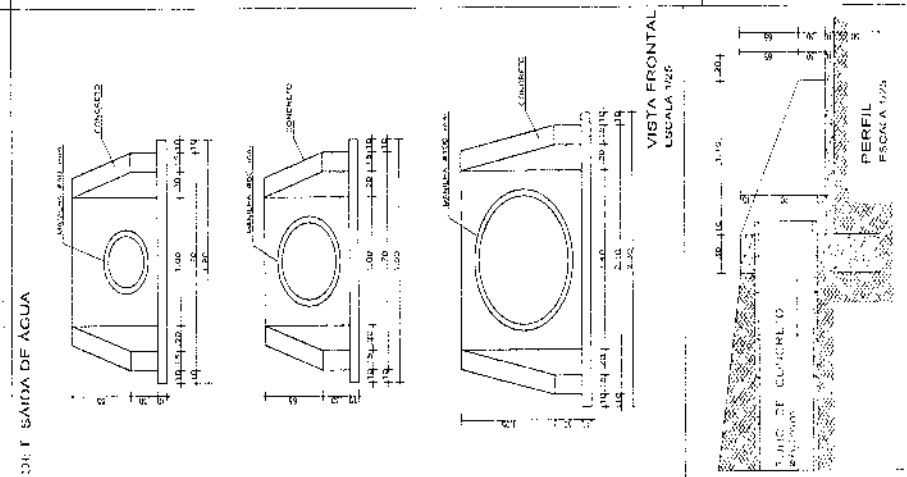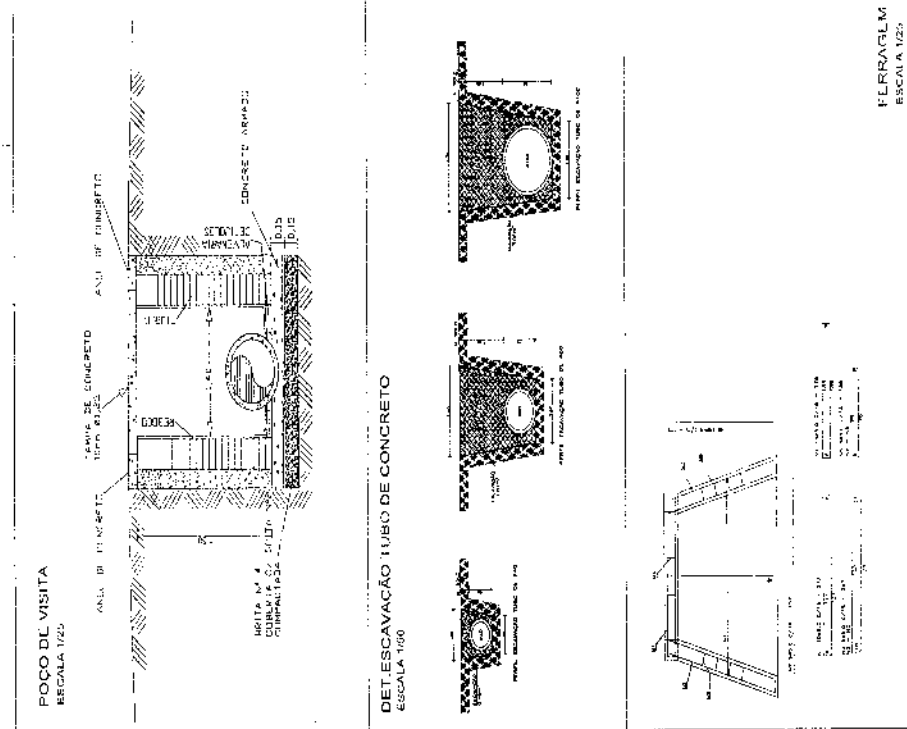



COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOPTADOS – 86,44%

DATA-BASE – DEZEMBRO DE 2023

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOPTAMOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

Dezembro/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, listelada - Rev 02_01/2022				m2	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrile) 6 x 6cm - 0,0030 m3/m (engelim, louro)	m	4	7,19	28,76	
06995/ORSE	Madeira mista serrada (serrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	m	1	3,51	3,51	
012115/SINAPI	Carpinteiro de tornos (horista)	h	1	8,57	8,57	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	6,00	12,00	
05079/SINAPI	Prego de aço oxide com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 1 1/8)	kg	0,15	17,04	2,56	
04614/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", ondulada, de 2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	m2	1	260,00	260,00	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,82	7,64	
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1	3,71	3,71	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,02	304,04	29,57	17,78	2,06	344,57	

Dezembro/2023-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
04175/ORSE	Locação de praças com produtos de madeira	M2			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrile) 6 x 6cm - 0,0030 m3/m (engelim, louro)	m	0,324	7,19	2,33
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,01	6,00	0,06
00446/ORSE	Auxílio topografia - SICO	h	0,005	10,25	0,05
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 1 1/8" (15 x 18)	kg	0,0005	19,09	0,01
03079/ORSE	Topógrafo - SICO	h	0,015	17,49	0,26
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,01	3,82	0,04
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,20	2,20	0,20	0,17	3,01	3,58

Dezembro/2023-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
05089/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Resgovernamento 2 vezes	m2			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01054/ORSE	Barracão para esportar de obra parte médio 443,56m2 com materiais	m2	0,015	20.894,14	240,28

COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOITADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,05	167,26	32,86	28,40	3,09	731,67

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
05021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,05	8,57	0,43
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	6,00	3,00
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,82	1,91
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,05	3,72	0,19
Totais					

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,05	1,65	3,43	2,90	0,38	6,46

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,26	8,57	2,23
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,00	3,60
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,82	2,29
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,26	3,72	0,97

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,05	2,04	4,11	3,55	0,46	10,16

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
08013/ORSE	Demolição do concreto magistralmente	m3

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3	8,57	11,14
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	13	6,00	78,00
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	13	3,82	49,66
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,3	3,72	4,84



Segunda-feira
29 de julho de 2024
Ato IV - Edição Nº 2718

- 137 -

Imprensa Oficial do Município de Santa Maria da Vitória

EXECUTIVO

Processo: 23939e24 - Doc: 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bb4db697b5d8

COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

OSBS: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Código	Descrição do Serviço	Unidade			
08400/ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim: (40x40x60cm), no piso	un			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 00600/ORSI	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	7,26	104,43	758,01
 00120/ORSI	Concreto simples fabricado na obra, 12cm 15 mpa, lançado e arreado	m3	0,0665	192,14	12,78
 00110/ORSF	Aço CA - S10 (B-3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragem nas formas, para supeléstios e fundações - R)	kg	4,65	12,74	59,24
 02492/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,32	49,71	15,91
 04112/ORSF	Corda em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M2	0,15	630,36	94,55
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,26	281,75	76,24	65,90	7,27	431,46

Dezembro/2023-1

Código		Descrição do Serviço	Unidade		
12432/ORSI		Refletor TR-Lud, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, oval, temporizador 300SK/SD6, IP-65, da Toscan ou similar	un		
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	8,57	4,29
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,00	1,80
 02436/ORSI	Refletor TR-Lud, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, oval, temporizador 300SK/SD6, IP-65, da Toscan ou similar	un	1	41,00	41,00
 00540/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,82	1,15
 00540/ORSI	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5	3,68	1,84
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	43,41	6,09	5,26	0,56	55,32

Dezembro/2023-1

		Serviço				
Código		Descrição do Serviço			Unidade	
04530/ORSE		Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm			un	
Composição de Preço						
Código		Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01402/ORSE		Porta madressa metálica	un	1	8,00	8,00
06111/SINAPI		Servente de obras (horista)	h	1	6,00	6,00
06100/SINAPI		Soldador (horista)	h	2	9,06	18,12
00997/SINAPI		Eletrodo revestido AWS - E7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	0,15	27,43	4,11
04224/ORSI		Dobradora de ferro zincado 2 1/2"	un	2	2,71	5,42
04221/ORSI		Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1/2" x 1/8" (6,55 kg/m)	m	2	4,04	8,08
04222/ORSI		Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (8,67 kg/m)	m	2	9,54	19,08
03430/ORSI		Tela de aço galvanizado, 12 un2, malha 1", ondulado, quadrado, sem revestimento	m2	0,25	137,12	34,28

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

IMPRESSÃO POR: AG CERTSIGN SRF ICP-BRASIL - IMPRESSÃO



COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

	10549/ORSF	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,82	3,82
	10623/ORSF	Encargos Complementares - Schlarshi	h	2	4,42	8,84

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	84,61	24,12	20,85	2,05	136,64

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
03582/ORSF	Torneira cromada para tanques/jardim, 1/2", ref: 1157 (330, DCEA ou similar	un

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00951/ORSF	Fita veda rosca 18mm	m	0,5	0,21	0,11
02696/SINAPI	Engenheiro ou bombeiro hidráulico (liandista)	h	0,5	8,57	4,28
06111/SINAPI	Servente de obras (Pintista)	h	0,5	6,00	3,00
11762/SINAPI	Torneira metálica cromada para jardim / tanque, com bloc plástico, cromo longo, de parede, padrão popular / uso geral - 1/2 " no 3/4 " (ref: 1157 / 1330)	un	1	55,86	55,86
10549/ORSF	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,82	1,91
10554/ORSF	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5	3,75	1,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	59,06	7,20	6,33	4,69	73,34

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
08777/ORSF	Hinoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 a 15 l/h e pressão de 0 a 15 bar	un

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
08779/ORSF	Hinoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 a 15 l/h e pressão de 0 a 15 bar	un	1	707,53	707,53
32436/SINAPI	Fita DMS (Pintista)	h	1	3,57	3,57
13252/ORSF	Encargos Complementares - Eletroista	h	1	3,68	3,68

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	211,62	8,57	7,41	3,69	227,29

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
03418/ORSF	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/defic. entes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acríl. rejuntado, exclusiva regularização de base	m²

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
--------	-------------------------	------	-------	-------------	-------------

COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

ORSE: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,02	476,01	12,70	10,08	1,14	502,92

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
03742/ORSE	Banço de concreto armado Fck=20MPa, dim. 2,30x0,69m, com escova em madeira angelim, dim. 2,06x0,59 a 0,2Rm, esp. 15cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARKLACK CETOL (HAKURA, 02 demãos - Rev 04_04/2022)	un

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Costo Unit	Costo Total
00083/OMSL	Arço L=25 6,3 a 12,5 mm	kg	1,4	8,47	11,86
02049/OMST	Formato em madeira madeira angelim ou similar, dimensionado 2,06x0,59 a 0,2R, espessura 0,05m, forma semi-elíptica, para bancos de concreto	m²	1	1.600,21	1.600,21
02159/OMSE	Forma metal col. seção em "U" 6x0,5cm, em chapão n=3/16" (0,015m² (0,015m²), com placa com esp. de alumínio de 16mm, p/ fecho de encaixe de madeira em bancos, ou divisórias de comprimento	m	1	126,75	126,75
02085/OMSE	Forma em U 25x6 de aço ISO, n=1/8", desmontável e leve, para confecção de bancos de concreto, dimensionado 2,30x0,69m	m	0,0170	24.171,75	429,41
02082/OMSE	Accelerador de pega, isento de cloratos, marca PST-Pozzolan 20, embalagem de bomba com 35kg ou similar	kg	1,34	18,75	25,13
03037/OMSE	Verniz SPARKLACK CETOL (proteção de superfícies externas de madeira, Coral ou similar	l	2	44,97	89,94
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5	8,37	4,19
02602/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira de base oleosa/emulsionada em água	l	0,1	7,27	0,74
00111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	6,00	12,00
00160/SINAPI	Soldador (horista)	h	1,5	9,06	13,59
00122/SINAPI	Enfiteixa revestido aço - e70CR, Luminoso, qual n 4,00 mm	kg	0,15	27,43	4,11
00046/OMST	Forma de bancos em 16 mm em placa de alumínio - 16 mm em bancos de 16 mm, altura aparelhada	m	1	13,45	13,45
02049/OMSE	Forma de bancos em 16 mm em placa de alumínio - 16 mm em bancos de 16 mm, altura aparelhada	m	0,05	129,41	6,47
01527/OMSL	Forma de bancos em 16 mm em placa de alumínio - 16 mm em bancos de 16 mm, altura aparelhada	m	1	11,85	11,85
00261/OMSE	Forma quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m²)	m	0,5	12,09	6,05
00139/OMSL	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,4	12,38	17,33
00140/OMSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	40	12,74	510,40
02282/OMSE	Preparo de superfície com lixante e aplicação de 01 demão de líquido selador poroso	m²	4,3	8,02	34,49
02288/OMSE	Revestimento de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	4,3	17,48	75,16
03446/OMSE	Concreto simples armado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,2	570,86	114,18
02542/OMSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,82	7,64
02541/OMSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5	3,71	1,86
02542/OMSE	Encargos Complementares - Soldador	h	1,5	4,42	6,63
02542/OMSE	Encargos Complementares - Enfiteixa	h	0,15	27,43	4,11

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
72,45	2.015,69	86,29	76,32	8,10	3.050,85

Dezembro/2023-1

Serviço



COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENCARGOS SOCIAIS ADOOTADOS - 86,44%
DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Código	Descrição do Serviço	Unidade			
02724/ORSE	Planta - Moréia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 26112/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,09	6,00	0,54
 44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,09	6,82	0,61
 07426/ORSE	Planta - Moréia (Dietes bicolor)	un	1	39,72	39,72
 03850/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,074	2,69	0,20
 02206/ORSE	Terra vegetal	m3	0,032	85,71	2,74
 00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,005	22,67	0,11
 10544/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,09	3,82	0,34
 10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,09	3,82	0,34
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	45,33	1,15	0,00	0,12	46,50

Dezembro/2023-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
09032/ORSE	Planta - Palmeira d'Á (Coccothrinax) n=1,00m, fornecimento e plantio				un
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06112/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,00	6,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1	22,67	2,27
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1	6,82	6,82
10295/ORSE	Planta - Palmeira d'Á (Coccothrinax) n=1,00m	un	1	505,67	505,67
10544/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,82	3,82
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1	3,82	3,82
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	514,21	17,82	11,08	1,37	539,48

Dezembro/2023-1

Código		Serviço	Unidade		
04762/ORSE		Planta - Orquídea Vermelha n=1,00m, fornecimento e plantio	un		
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,005	22,67	0,11
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,23	6,82	1,57
09011/ORSE	Planta - Orquídea vermelha n=1,00m	un	1	39,72	39,72
02206/ORSE	Terra vegetal	m3	0,032	85,71	2,74

COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

ORS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

10561/ORSF	Encargos Complementares - Tardeline	h	0,28	3,82	0,88
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	43,39	1,57	1,76	0,16	46,39

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
12561/ORSF	Despachador de energia - Celo 01 (Padrão ONIT)	un

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
042085/SNAP	Pedra de mão ou pedra retilha para jardim/fundação (posto anti-aforticoerbor, sem frete)	m3	0,24	170,57	26,58
041117/SNAP	Servente de obras (horista)	h	0,28	6,00	1,68
00262/ORSF	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 63 cm	m2	2,71	97,50	262,47
02498/ORSF	Escavação manual de solo em cova em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	0,67	14,54	9,94
10549/ORSF	Encargos Complementares - Servente	h	0,28	3,82	1,07
11484/ORSF	Concreto simples armado fck=25mpa, homogeneizado e incorporado à infraestrutura	m3	0,42	524,26	220,22
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,29	187,31	79,67	6,65	7,97	543,59

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
07112/ORSF	Porta de entrada, em perfil metálico fechada com chapa de aço galvanizado nº 22	m2

Composição de Preço

Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
13470/ORSF	Porta de entrada, em perfil metálico fechada, com chapa de aço galvanizado nº 22	m2	1	314,98	314,98
04750/SNAP	Porteira (horista)	h	0,8	8,57	6,86
001117/SNAP	Servente de obras (horista)	h	0,8	6,00	4,80
01303/ORSF	Argamassa cimento e areia tipo 1-1 (1:1) - 4kg cimento 50kg / 3 pacotes areia 40kg, 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Condição mecânica e transporte	m3	0,016	542,79	8,68
10549/ORSF	Encargos Complementares - Servente	h	0,8	3,82	3,06
10550/ORSF	Encargos Complementares - Porteira	h	0,8	3,72	2,98
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	347,73	12,04	10,42	1,14	351,32

Dezembro/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade



COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERÊNCIA DO SINPI

Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
00461/ORSE	Caixa d'água fibra vidro 2.500 litros -Fortilex-Tenex (ou similar)	un	1	1.211,86	1.211,86	
00591/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7	0,21	1,41	
02506/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	4	8,57	34,28	
00117/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4	6,00	24,00	
01830/SINAPI	Tomadeira de buia concreto tipo para caixa d'água, água fria, 3/4", com haste e tomereia metálicos e tampo plástico	un	1	27,57	27,57	
02862/SINAPI	Tubo pvc, roscaável, 1 1/2", água fria predial	m	2,4	30,41	72,98	
03864/SINAPI	Luva pvc, roscaável, 3/4", água fria predial	un	2	2,35	4,70	
03878/SINAPI	Luva pvc, roscaável, 1 1/2", água fria predial	un	1	11,60	11,60	
03876/SINAPI	Luva pvc, roscaável, 1", água fria predial	un	2	4,62	9,24	
03492/SINAPI	Joelho pvc, roscaável, 90 graus, 1", cor: branco, para água fria predial	un	2	5,27	10,54	
00023/SINAPI	Adaptador pvc, roscaável, com flanges e anel de vedação, 3/4", para caixa d'água	un	1	15,10	15,10	
00122/SINAPI	Adaptador pvc, roscaável, com flanges e anel de vedação, 1/2", para caixa d'água	un	1	44,80	44,80	
00021/SINAPI	Adaptador pvc, roscaável, com flanges e anel de vedação, 1", para caixa d'água	un	2	30,14	60,28	
01451/ORSE	Registro paveta bruto, c/ volante, Ø = 25mm (1")	un	1	60,87	60,87	
03860/SINAPI	Tubo pvc, roscaável, 1", água fria predial	m	1,6	20,63	32,98	
00127/ORSE	Chapisco simples -caminado fck=21mpa, batizado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,12	542,78	65,13	
00449/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4	3,82	15,28	
00554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	4	3,75	15,00	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	1.652,96	60,38	52,19	8,70	1.771,23	

Dezembro/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço	Unidade				
00883/ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un				
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
00072/ORSE	Relevo manual de valas, com compactação utilizando xébo, sem controle do grau de compactação	m3	1,15	33,14	38,11	
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em cunha rígido resinado (2mm), 02 usos	m2	1,17	104,47	122,18	
00195/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,0 mpa, lançado e adensado	m3	0,081	565,46	45,80	
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,0 mpa, lançado e adensado	m3	0,083	542,14	47,96	
00110/ORSE	Aço CA - S0 60,3 a 12,5mm, inclusive corte, cobertura, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,73	12,74	22,04	
00155/ORSE	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,29m (singela), com argamassa traço 05 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	1,8	101,51	182,72	
01906/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,71	34,16	58,41	
02497/ORSE	Escavação manual de vala na cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,8	49,71	89,48	
03313/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 05 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,71	6,53	11,17	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,13	315,93	135,56	117,20	13,77	582,57	

COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS – 86,44%

DATA-BASE – DEZEMBRO DE 2023

ORS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Dezembro/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
02066/ORSI	Assento plastico, ultraleve, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.					un
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição		Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 00111/SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1	6,00	6,00
 00377/SINAPI	Assento sanitário de plastico, tipo convencional		un	1	37,98	37,98
 10549/ORSI	Encargos Complementares - Servente		h	1	3,62	3,62
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	41,03	6,00	6,19	0,00	53,22	

Dezembro/2023-1

Serviço		Unidade			
Código	Descrição do Serviço				
01886/ORSI	Escritório plano 4m²	m²			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01186/SINAPI	Escritório plano 4m²	m²	1	430,00	430,00
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Dezembro/2023-1

Serviço		Unidade			
Código	Descrição do Serviço				
00750/ORSI	Bancada em granito 60x200cm, esp=2cm	m²			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02585/ORSI	Bancada em granito 60x200cm, esp=2cm	m²	1	516,98	516,98
03116/ORSI	Contramedida alumínio anodizado natural, 1" x 1/2" - vareta com fim - 0,400 kg/m	m	0,6	12,99	7,79
04250/SINAPI	Perfiteiro (horista)	h	0,65	8,57	5,57
00111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,14	6,00	6,84
10549/ORSI	Encargos Complementares - Servente	h	1,14	3,62	4,15
10550/ORSI	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,65	3,72	2,42
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	530,29	12,41	10,73	1,28	554,65

Dezembro/2023-1



COMPOSIÇÃO DO ORSE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - 86,44%

DATA-BASE - DEZEMBRO DE 2023

ORSE: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Código		Serviço	Unidade			
0853//ORSE		Chapim de concreto pré-moldado	m			
Composição do Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
00081//ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,8	8,83	7,06	
00127//ORSE	Concreto 5 mpas usando 1ck-21mpa, bombeado, lançado e acurado em equipamento	m3	0,31	542,78	5,43	
11640//ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 13mm, 02 usos, inclusive escuramento - Revisado 07/2015	m2	0,36	111,50	39,96	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,03	40,61	1,88	4,22	0,41	46,15	



Sexta-feira
29 de julho de 2024
15:11:49, 02/07/2024

- 146 -

EXECUTIVO

Processo: 23939e24 - Doc: 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2629a71-3715-4c2c-a04d-bdbb697b5d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA									
PRELIMINAR DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA									
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS									
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	120,00			
5	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM JANELA	M²	1,20	120,00			
							TOTAL		
							120,00		
EMPRESA: UP									
NOME: PLANTA BROMELIA									
Município: UP									
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PAREDE	M²	1,20	120,00			
2	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM TETO	M²	1,20	120,00			
3	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM CHÃO	M²	1,20	120,00			
4	MAT	100,00	100,00 M² DE PINTURA EM PORTA	M²	1,20	1			

EXECUTIVO

Nível	Item	Fornec	Codifun	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Idol (%)	Preço Unitário	Preço Total
Nível 2	1.7.1	SINAPI	96535	INFRA-ESTRUTURA						
	1.7.1	SINAPI	96535	ARRUAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA RAIO DRAMF, FM MADEIRA SEMIADA, E32E MM, 4 UTILIZADORES AF 09/2017	M2	777,77	90,24	80,1	101,21	78.727,46
	1.7.2	SINAPI	92419	UTILIZADORES DE CONCRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M2	41,20	84,52	80,1	106,61	4.392,33
Nível 3	1.7.3	SINAPI	92367	ARRUAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M2	174,20	42,30	80,1	53,09	9.237,95
	1.7.4	SINAPI	101002	ARRUAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M2	174,20	12,87	80,1	16,23	2.825,30
Nível 4	1.7.5	SINAPI	93507	ARRUAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M	97,00	102,06	80,1	126,74	7.338,18
	1.7.6	CRSP	92404	ARRUAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M3	75,00	138,52	80,1	172,21	12.915,75
Nível 5	1.7.7	SINAPI	101037	ARRUAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, FM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZADORES AF 09/2020	M	480,00	1,77	80,1	2,23	1.070,40
	1.7.8	SINAPI	96543	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	4,6304	17,49	80,1	22,06	9.663,16
Nível 6	1.7.9	SINAPI	96544	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	315,03	15,95	80,1	19,95	14.293,06
	1.7.10	SINAPI	96545	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	14,44	12,49	80,1	16,01	5.820,46
Nível 7	1.7.11	SINAPI	96546	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	101,04	14,69	80,1	18,21	2.478,15
	1.7.12	SINAPI	96547	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	10,65	10,65	80,1	13,43	41.573,10
Nível 8	1.7.13	SINAPI	96548	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	527,70	965,68	80,1	1.213,96	72.726,64
	1.7.14	SINAPI	89215	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	109,25	290,89	80,1	365,87	39.949,45
Nível 9	1.7.15	SINAPI	89216	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M	203,00	89,55	80,1	112,96	22.992,00
	1.7.16	SINAPI	106788	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M	266,00	352,69	80,1	443,10	118.396,60
Nível 9	1.8	SINAPI	92419	ARRUAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M2	111,27	84,52	80,1	106,61	312.917,11
	1.8.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E TANQUELARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZADORES AF 09/2020	M2	111,27	84,52	80,1	106,61	12.715,37
Nível 10	1.8.2	SINAPI	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZADORES AF 09/2020	M2	429,45	97,34	80,1	122,78	51.870,32
	1.8.3	SINAPI	92760	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	12,33	13,80	80,1	17,53	8.891,74
Nível 11	1.8.4	SINAPI	92760	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	179,98	13,04	80,1	16,46	7.812,82
	1.8.5	SINAPI	92761	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	267,00	12,20	80,1	15,39	4.784,21
Nível 12	1.8.6	SINAPI	92762	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	17,31	10,84	80,1	13,67	2.371,86
	1.8.7	SINAPI	92763	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	2,1450	9,11	80,1	11,49	31.481,45
Nível 13	1.8.8	SINAPI	92764	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	344,00	8,80	80,1	11,10	3.816,40
	1.8.9	SINAPI	93505	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	112,41	227,43	80,1	465,68	71.500,60
Nível 14	1.8.10	SINAPI	103570	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2020	M3	107,41	289,49	80,1	465,68	39.276,61



EXECUTIVO

[illegible]

EXECUTIVO

[illegible]

EXECUTIVO

Nº	Item	Fonte	Origem	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
116.7	SINAPI	1003848	SINAPI	BARBA DE AQUINO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 810 CM, FIXAÇÃO NA	UN	1,00	319,79	RD1	403,38	1.617,52
116.8	SINAPI	318320252	SINAPI	PARDE DE FURNO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 810 CM, FIXAÇÃO NA	M2	2,00	430,00	BD1	942,40	1.044,28
116.9	SINAPI	86644	SINAPI	BARRA DE FURNO DE FIM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIMACAO	UN	38,00	30,36	BD1	76,80	2.910,08
117.0	SINAPI	95547	SINAPI	SARONETINA PLASTICA TIPO DESPRENSAR PARA SARDONETES LIGADOS COM	M2	2,00	67,43	BD1	90,43	170,86
117.1	SINAPI	10739044	SINAPI	RESEALVADOR BETA 3100 ML, INCLUSO FIMACAO, AF 12/2015	M2	2,00	224,95	BD1	470,94	4.102,94
117.2	SINAPI	80512	SINAPI	TIPO PVC, SERIE N, AQUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECEDOR E INSTALADO EM RUAVAL DE	M	7,00	43,61	BD1	55,01	418,08
118.1	SINAPI	87935	SINAPI	CAIXA PARA LUGA DE LUGO SIMPLES RETANGULAR, UN CONCRETO PRE-MOLDADO,	UN	16,00	866,73	BD1	1.142,49	18.279,84
118.2	SINAPI	99622	SINAPI	DIAMETROS INTERNOS: 3,81 X 0,12 M, AF 12/2015, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA	UN	4,00	3.846,82	BD1	3.716,74	15.668,08
118.3	SINAPI	98240	SINAPI	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-M	M	4,30	738,17	BD1	942,39	3.729,30
118.4	SINAPI	95567	SINAPI	TUBO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM PAVIMENTO DE	M	4,50	109,04	BD1	174,74	579,03
118.5	SINAPI	92210	SINAPI	INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO	M	95,10	185,79	BD1	234,36	21.155,84
118.6	SINAPI	92212	SINAPI	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF 12/2015	M	1,00	333,19	BD1	420,29	1.260,87
118.7	SINAPI	92216	SINAPI	TUDO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000	M	41,17	634,98	BD1	809,06	33.135,72
118.8	SINAPI	1003848	SINAPI	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF 12/2015	M	2,00	543,59	BD1	646,33	1.271,36
118.9	SINAPI	98555	SINAPI	INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO	M2	7,89	31,75	BD1	49,49	2.777,81
119.2	SINAPI	98546	SINAPI	INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO TAMPA, INCLUSO	M2	11,76	129,41	BD1	151,09	1.765,23
120.1	SINAPI	94273	SINAPI	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-M	M	10,77	44,52	BD1	56,16	6.024,26
120.2	SINAPI	94279	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M	1,00	39,90	BD1	50,33	5.087,10
120.3	SINAPI	94882	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M	1,00	39,90	BD1	50,33	5.087,10
120.4	SINAPI	318320252	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	4,00	421,25	BD1	531,36	2.122,01
120.5	SINAPI	94990	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	10,43	119,69	BD1	140,80	1.422,96
120.6	SINAPI	92305	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	1,11	803,90	BD1	1.014,04	1.348,39
120.7	SINAPI	93680	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	182,02	18,46	BD1	46,36	57.112,06
120.8	SINAPI	92303	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	47,23	65,08	BD1	82,09	5.693,09
120.9	SINAPI	92303	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	121,95	64,67	BD1	82,09	9.376,11
120.10	SINAPI	92394	SINAPI	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 10 CM, COMPRIMENTO X BASE	M2	116,26	47,67	BD1	65,36	10.097,21



EXECUTIVO

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Pieço Total
Servço	1.20.10	SINAPI	82392	PREPARAÇÃO DE CIMENTO EM PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 10/2022	M2	159,19	110,27	BDI 1	131,09	22.141,74
Servço	1.20.11	SINAPI	101034	CONCRETO EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, OU PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 10/2022	M2	10,63	75,32	BDI 1	81,71	3.852,86
Servço	1.20.12	SINAPI	94980	PREPARAÇÃO DE CIMENTO EM PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	7,19	52,73	BDI 1	60,56	4.706,24
Servço	1.20.13	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, AUMENTO DE E ACRESCIMO DE CONCRETO EM PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	7,19	269,69	BDI 1	305,67	2.629,17
Servço	1.20.14	SINAPI	87620	CONCRETO EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, OU PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	33,78	61,05	BDI 1	61,05	1.138,32
Servço	1.20.15	SINAPI	87263	CONCRETO EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, OU PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	143,21	163,65	BDI 1	163,65	4.113,68
Servço	1.20.16	SINAPI	88289	CONCRETO EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, OU PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	3,40	106,42	BDI 1	106,42	362,38
Servço	1.20.17	OSIEL	11010060	CONCRETO EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, OU PREGO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	280,73	424,22	BDI 1	1026,11	310.221,43
Nível 2	1.21.1	SINAPI	87679	REVESTIMENTO EM MASSA ESPALHADA EM CIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO, COM CIMENTO DE FIDRICO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	M2	564,23	4,69	BDI 1	5,80	62.407,84
Servço	1.21.2	SINAPI	87329	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	428,62	42,98	BDI 1	56,21	23.236,49
Servço	1.21.3	SINAPI	87536	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	136,63	37,98	BDI 1	47,03	6.460,54
Servço	1.21.4	SINAPI	87273	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	124,96	61,04	BDI 1	77,00	9.621,15
Servço	1.21.5	SINAPI	88788	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	0,06	242,81	BDI 1	306,41	3.260,33
Servço	1.21.6	SINAPI	87636	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	46,57	214,05	BDI 1	270,00	2.573,90
Servço	1.21.7	SINAPI	101085	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	1,60	109,41	BDI 1	126,66	202,66
Servço	1.21.8	OSIEL	08637600	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	59,80	59,18	BDI 1	63,30	3.785,34
Servço	1.22.1	SINAPI	88485	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	382,06	3,90	BDI 1	4,92	24.280,59
Servço	1.22.2	SINAPI	88596	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	67,46	31,01	BDI 1	39,12	2.247,84
Servço	1.22.3	SINAPI	88118	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	218,03	28,09	BDI 1	31,43	7.746,06
Servço	1.22.4	SINAPI	122.4	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	304,60	12,30	BDI 1	15,84	5.037,78
Servço	1.22.5	SINAPI	88488	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	37,46	14,03	BDI 1	18,48	1.060,14
Servço	1.22.6	SINAPI	100750	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	22,35	24,08	BDI 1	31,81	2.770,75
Servço	1.22.7	SINAPI	102482	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	77,14	26,39	BDI 1	32,03	2.470,79
Servço	1.22.8	SINAPI	102213	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	40,37	29,76	BDI 1	36,10	1.065,84
Servço	1.22.9	SINAPI	102950	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	219,16	3,67	BDI 1	3,71	8.048,91
Servço	1.22.10	SINAPI	88488	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BLOCO PROGRAMADO DE 30 X 15 CM, ESPESURA 8 CM AF. 05/2021	M2	40,37	3,67	BDI 1	3,71	8.048,91

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BOI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.23.2	SINAPI	08116	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AP. 05/2018	UN	4,00	300,74	RO 1	504,23	2.016,02
Serviço	1.23.3	SINAPI	08100	PLANTIO DE ARBUSTO 037 CERCA VIVA, AP. 05/2018	UN	4,00	168,64	RO 1	78,31	309,24
Serviço	1.23.4	SINAPI	08111	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUP 2,00 M F. MIPION	UN	9,00	168,64	BOI 1	212,72	1.914,48
Serviço	1.23.5			IGUAL A 4,00 M, AP. 05/2018				RO 1		
Serviço	1.23.6							RO 1		
Serviço	1.23.7							BOI 1		

Encargos sociais:

Obrservações:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BOI, Preço Unitário, Preço Total.

SANTA MARIA DA VITÓRIA, BA
Local
04 de Junho de 2024
Data

Nome: VILRI DE BELO NUNES
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CRECAU 36.0517
ARTNAT

http://portalcasaspremiacabavitoria.mamasantantania.org






EXECUTIVO


Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bbbdbb697b5d8

[illegible]




Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bbd6b697b5d8

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Processo: 23939e24 - Doc. 1153 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:19
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2629fa71-3715-4c2c-a04d-bbbdb697b5d8

[illegible]

Assinatura
29 de julho de 2024
ou IV - Edição Nº 2713

- 162 -

Projeto de Engenharia de Santa Maria de Vitória - BA

Diário
EXECUTIVO

Item	Descrição das Obras / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 09/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
1.13.	INSTALAÇÃO ELETRICA	60.365,41	Acumulado (R\$) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.14.	Hidráulica	11.105,80	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.15.	Sanitária	24.592,18	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.16.	Louças e acessórios	10.271,54	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.17.	Água pluvial	418,08	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.18.	DEBENEFICIAMENTO	84.339,48	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.19.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.777,81	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.20.	PAVIMENTAÇÃO	297.260,95	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.21.	REVESTIMENTO	52.402,91	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.22.	PINTURA	24.280,59	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.23.	PAISAGISMO	6.845,91	Parcela (%) Acumulado (R\$) Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Local
Data
29 de julho de 2024

2/276 - 0008 - 01/00

http://pmsantamariadevitoria.ba.imprensaoficial.org/

22 427 62136 301674

Author	Year	Journal	Volume	Page
W. J. G. M. van den Broek	1998	Journal of Management Education	22	1000-1010
W. J. G. M. van den Broek	1999	Journal of Management Education	23	1000-1010

[illegible][illegible]

PLE - Planilha de Levantamento de Evidências

ACAD / MODALIDADE

Grav de sigla
NPNLCO
DATA ASSINATURA

EXECUTIVO

-163-

812 North Ave.
New York, N.Y. 10017

Segunda-feira
29 de julho de 2024
Ano IV • Edição Nº 2718

Notanda-féita
29 de julho de 2024
Ano IV - Edição N° 2718

Procedimento Administrativo Nº 001.000.000.000

- 167 -

EXECUTIVO

CAIPA

Nº OPERAÇÃO		Nº SIGOV	GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		RECURSO		
PROPOSTA / TOMADA DE DECISÃO		MINISTÉRIO DO TURISMO		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
OBJETO DO EMPENDIMENTO		CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA		CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA		CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA		CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA		CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA	
VALORES CONTRATADOS (R\$)		R\$ 1.441.714,00		R\$ 1.441.714,00		R\$ 1.441.714,00		R\$ 1.441.714,00		R\$ 1.441.714,00	
CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO		R\$ 58.285,68		R\$ 58.285,68		R\$ 58.285,68		R\$ 58.285,68		R\$ 58.285,68	

Etapas	Meta / Sub-Meta	TÍTULOS DE INVESTIMENTO	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Resposta (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Meta 1	1	1	CONSTRUÇÃO	Em Análise	1,00	m²	1	1.441.714,00	58.285,68	-	1.499.999,68
2	Meta 2	2	2									
3	Meta 3	3	3									
4	Meta 4	4	4									
5	Meta 5	5	5									
6	Meta 6	6	6									
7	Meta 7	7	7									
8	Meta 8	8	8									
9	Meta 9	9	9									
10	Meta 10	10	10									
TOTAL												
TOTAL - ETAPA												
TOTAL - ETAPA												

Representante Titular / Agente Promotor

Cargo

Assinatura

Data: 04 de junho de 2024

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

